



मन्त्रालयस्तरीय विकास समस्या समाधान समितिको बैठक तथा
आ.व.०७९/८० को

वार्षिक प्रगति समीक्षा-२०८०

1

मिति :- २०८० श्रावण ८ र ९ गते
स्थान: भौतिक पूर्वाधार विकास
मन्त्रालयको सभाहल, राप्ति

प्रस्तुतकर्ता:
नि.डि.प्र. श्री भेष राज भुसाल
जलस्रोत तथा सिंचाई विकास डिभिजन
कार्यालय
रोल्पा

कृषिको आधार : सिंचाइमा सुधार

प्रस्तुती सूची

2

- कार्यालयको जनशक्ति अवस्था
- कार्यालयको समग्र वित्तीय तथा भौतिक प्रगति अवस्था
- बजेटको श्रोतगत प्रगति अवस्था
- योजना कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या, प्रयास तथा उपायहरू
- बेरुजु तथा सम्परीक्षणको अवस्था
- केही राम्रा अभ्यास तथा सूचना प्रविधिको उपयोग
- केही स्थलगत फोटोहरू

कार्यालयको समष्टिगत जनशक्ति विवरण

क्र.सं.	सेवा	स्वीकृत दरबन्दी			पदपूर्ति	स्थायी रिक्त दरबन्दी	कैफियत
		स्थायी	अस्थायी	जम्मा			
१	प्राविधिक	७	-	७	२	५	
२	प्रशासनिक	४	१	५	४	१	कार्यालय सहयोगी समेत गरि
	कूल	१२	१	१२	६	६	

पदपूर्ति र रिक्त विवरण

क्र.सं.	पद	सेवा	समूह	उप-समूह	तह/श्रेणी	स्वीकृत			पदपूर्ति		रिक्त	कै.
						स्थायी	अस्थायी	जम्मा	स्थायी	करार/ज्या.		
१	सि.डि.ई.	इन्जि.	सिभिल	ईरिगेशन	अधिकृत नवौं/दशौं	१	-	१	-	-	१	
२	इन्जिनियर	इन्जि.	सिभिल	सिंचाइ	अधिकृत सातौं/आठौं	२	-	२	१	-	१	
३	सहायक/अधिकृत	प्रशासन	सा.प्र.		स.पाँचौं/अ.छैटौं	१	-	१	१	-	-	
४	सहायक/अधिकृत	प्रशासन	लेखा		स.पाँचौं/अ.छैटौं	१	-	१	-	-	१	
५	सब.ई./अधिकृत	इन्जि.	सिभिल	सिंचाइ	स.पाँचौं/अ.छैटौं	३	-	३	१	-	२	
६	ए.ओ.				स.पाँचौं/अ.छैटौं	१	-	१	-	-	१	
७	ह.स.चा.					-	१	१	-	१	-	
८	का.स.					२	-	२	१	१	-	
	जम्मा					१२	-	१२	४	२	६	

पदपूर्ति र रिक्त विवरण

क्र.सं.	कर्मचारीको नाम	पद	सेवा	समूह/उप-समूह	तह/श्रेणी	हालको कार्यालयमा पदस्थापन वा काज	हालको कार्यालयमा सरुवा मिति	हालको कार्यालयपूर्व रहेको कार्यालयको नाम	शैक्षिक योग्यता	कै.
१	भेषराज भुसाल	इन्जिनियर नि डिभिजन प्रमुख	इन्जि.	सिभिल/इरिगेशन	सातौँ तह	पदस्थापना	२०७७।११।१०	ज तथा सिं वि डि का रुपन्देही	ME	
२	किसनजी कुवँर	सब इन्जिनियर	इन्जि.	सिभिल/इरिगेशन	पाचौँ तह	पदस्थापना	२०७३।०८।१५	शुरु नियुक्ति	BE	
३	श्यामलाल रावत	ना सु	प्रशासन	सा. प्रशासन	पाचौँ तह	कामकाज	२०७५।०८।२८	श वि तथा भवन डि का रोल्पा	SLC	
४	तिलकराम के सी	का स	प्रशासन	सा. प्रशासन	श्रेणी बिहिन	पदस्थापना	२०७५।०८।०२	जिल्ला भू संरक्षण कार्यालय रोल्पा		
५	ओम प्रकास खड्का	का स	प्रशासन	सा. प्रशासन	श्रेणी बिहिन	करार				
६	खुम बहादुर के सी	ह स चा	इन्जि	मेकानिकल	श्रेणी बिहिन	करार				

आ.व.०७९/८० को वार्षिक प्रगति सारांश

रु.हजारमा

क्र. सं.	बजेट शिर्षक	शुरु वार्षिक विनियोजन	संशोधित वार्षिक विनियोजन	वार्षिक खर्च	खर्च (%)	कैफियत
१	चालु	१०६७९.००	१०१४५.३२८	६९३९.४२२	६८.९४	
२	पूँजीगत	१९९४००	१६८९८३.२९५	१६५०१२.०१	९७.७१	
	कूल जम्मा	२१००७९.००	१७९१२८.६२३	१७१९३३.४३	९६.०५	

आ.व.०७९/८० को तेस्रो चौमासिक प्रगति सारांश

रु.हजारमा

क्र.सं	बजेट शिर्षक	तेस्रो चौमासिक विनियोजन	तेस्रो चौमासिक खर्च	खर्च (%)	कैफियत
१	चालु	३०८७.००	२५९४.२२२	८४.०३	
२	पूँजीगत	७१७१६.००	९६९०३.४१५	१३५.१२	
	कूल जम्मा	७४८०३.००	९९४९७.६३७	१३३.०१	

आयोजना कार्यान्वयनको अवस्था (सिंचाइ)

सि.नं.	कार्यक्रमको नाम	आयोजनाहरूको कार्यान्वयन अवस्था (संख्या)					कैफियत
		कूल	खरिद प्रक्रियामा	कार्यान्वयन भैरहेका	यस आ.व.को हालसम्म सम्पन्न भएका	कार्यान्वयन हुन नसकेका	
क	समानिकरण						
१	मझौला तथा वैकल्पिक प्रविधिमा आधारित सिंचाइ आयोजना	२२	-	८	११	३	
२	सिंचाई आयोजना मर्मत सुधार तथा विस्तार कार्यक्रम	२२	-	-	२१	१	
३	जल उत्पन्न प्रकोप न्यूनिकरण तथा व्यवस्थापन कार्यक्रम	२६	-	-	२५	१	
४	जलासय निर्माण तथा पोखरी संरक्षण कार्यक्रम	६	-	-	५	१	
	समानिकरण जम्मा	७६	०	८	६२	६	
ख	सशर्त						
१	मझौला सिंचाइ आयोजना	३	-	-	३	-	
२	मर्मत सुधार आयोजना	१	-	-	१	-	
३	नदी नियन्त्रण	९	-	-	९	-	
४	नयाँ प्रविधिमा आधारित नदी नियन्त्रण	१३	-	-	१३	-	
५	एकिकृत उर्जा तथा सिंचाइ विकास कार्यक्रम	५०	-	-	४	३६	१० वटा फिर्ता
	सशर्त जम्मा	७६	०	-	३०	३६	
	कूल जम्मा (क)+(ख)	१५२	०	८	९२	४२	

कार्यान्वयनमा रहेका योजनाहरुको समष्टिगत भौतिक प्रगति

क्र.सं.	कार्यक्रमको नाम	कूल आयोजनाहरुको संख्या	>८०% प्रगति भएको संख्या	५०-८०% प्रगति भएको संख्या	<५०% प्रगति भएको संख्या	कार्यान्वयन हुन नसकेका
क	समानिकरण					
१	मझौला तथा वैकल्पिक प्रविधिमा आधारित सिंचाइ आयोजना	२२	१७	-	२	३
२	सिंचाई आयोजना मर्मत सुधार तथा विस्तार	२२	२१	-	-	१
३	जल उत्पन्न प्रकोप न्यूनिकरण तथा व्यवस्थापन	२६	२५	-	-	१
४	जलासय निर्माण तथा पोखरी संरक्षण कार्यक्रम	६	५	-	-	१
	समानिकरण जम्मा	७६	६८	-	२	६
ख	सशर्त					
१	मझौला सिंचाइ आयोजना	३	३	-	-	-
२	मर्मत सुधार आयोजना	१	१	-	-	-
३	नदी नियन्त्रण	९	९	-	-	-
४	नयाँ प्रविधिमा आधारित नदी नियन्त्रण	१३	१३	-	-	-
५	एकिकृत उर्जा तथा सिंचाइ विकास कार्यक्रम	४०	४	-	-	३६
	संघ शसर्त अनुदान तर्फका कार्यक्रमहरु	६६	३०	०	०	३६
	कूल जम्मा	१४२	९८	०	२	४२

बजेटको श्रोत अनुसार प्रगति विवरण

रु.हजारमा

सि. नं.	बजेटको श्रोत	जम्मा आयोजना संख्या	वार्षिक विनियोजन	वार्षिक खर्च	वार्षिक प्रगति		कार्यान्वयनमा गएका आयोजना संख्या	सम्पन्न भएका आ. संख्या	कैफियत
					भौतिक (%)	वित्तीय (%)			
१	समानीकरण/ राजश्व अनुदान	७६	१२०२८३.२९५	११७२७८.१०	९९.५	९७.५०	७०	६२	
२	सशर्त अनुदान	६६	४८७००.००	४७७३३.९१३	९९.६	९८.०२	३०	३०	
	जम्मा	१४२	१६८९८३.२९५	१६५०१२.०१	९९.५५	९७.७१	१००	९२	

कार्यक्रमगत प्रगति विवरण (सिंचाइ)

रु.हजारमा

क्र. सं.	कार्यक्रमको नाम	वार्षिक बजेट	वार्षिक खर्च	वार्षिक प्रगति		कैफियत
				भौतिक(%)	वित्तीय(%)	
क	समानिकरण					
१	मझौला तथा वैकल्पिक प्रविधिमा आधारित सिंचाइ आयोजना	७०४००.००	६८१९९.६१२	९९	९६.८७	
२	सिंचाई आयोजना मर्मत सुधार तथा विस्तार	९८६३.२९५	९६३२.१९७	१००	९७.६६	
३	जल उत्पन्न प्रकोप न्यूनिकरण तथा व्यवस्थापन	३४५१०.००	३३९६५.०६१	९९	९८.४२	
४	जलासय निर्माण तथा पोखरी संरक्षण कार्यक्रम	५५१०.००	५४८१.२२५	१००	९९.४८	
	समानिकरण जम्मा	१२०२८३.२९५	११७२७८.१०	९९.५	९७.५०	
ख	सशर्त					
१	मझौला सिंचाइ आयोजना	११०००.००	१०९८०.६४४	१००	९९.८२	
२	मर्मत सुधार आयोजना	१०००.००	९८२.०४२	१००	९८.२०	
३	नदी नियन्त्रण	९५००.००	९२९२.११६	१००	९७.८१	
४	नयाँ प्रविधिमा आधारित नदी नियन्त्रण	१८५००.००	१८०५४.१२३	१००	९७.६०	
५	एकिकृत उर्जा तथा सिंचाइ विकास कार्यक्रम	८७००.००	८४२४.९८८	९८	९६.८०	
	सशर्त जम्मा	४८७००.००	४७७३३.९१३	९९.६	९८.०२	
	कूल जम्मा (क)+(ख)	१६८९८३.२९५	१६५०१२.०१	९९.५५	९७.७१	

मुख्य-मुख्य आयोजनाहरुको प्रगति विवरण

रु.हजारमा

क्र. सं.	कार्यक्रमको नाम	वार्षिक बजेट	वार्षिक खर्च	हाल सम्मको खर्च	वार्षिक प्रगति		कैफियत
					भौतिक(%)	वित्तीय(%)	
क	कार्यक्रमको नाम						
१	घान्टुखोला सिं यो रोल्पा २	१०००	९६९.३९	१४००२	१००	९६.९३	ठेक्का सम्पन्न
२	चिउरीधारा सिं यो रोल्पा १०	४१००	४००९.२९	२५३७८.५५४	१००	९७.७८	ठेक्का सम्पन्न
३	दबसे लिफ्ट सिं यो लुङ्ग्री २	४०००	२९००.०८८	४४५३.०८८	९१	७२.५०	क्रमागत
४	धम्पाखोला हरिगाँउ महेन्द्री सिं यो सुनिलस्मृति २	२१५७०	२१५१७.८१८	२३५१७.८१८	१००	९९.७५	ठेक्का सम्पन्न
५	गुनामखोला कालिजङ् धनचौर सिं यो रुन्टीगढी १	९०००	८७८२.६०	९९०२.९६४	१००	९७.९८	ठेक्का सम्पन्न
६	मनगाड सिं यो सुनिलस्मृति ५	१०५००	१०२१४.८९६	१२१३८.३६७	१००	९७.९८	सम्पन्न
७	झागरखोला सिं यो त्रिवेणी ५	१५००	१४९५.९२८	९९००.९२८	१००	९९.७२	सम्पन्न

कार्यान्वयन हुन नसकेका आयोजनाहरुको विवरण

क्र.सं.	आयोजनाहरुको नाम	वार्षिक विनियोजन (रु.हजारमा)		कार्यान्वयन हुन नसक्नुका कारण	कैफियत
		शुरु बजेट	अन्तिम बजेट		
१	मिझिङ लिफ्ट सिंचाइ योजना सुनिलस्मृती ३ रोल्पा	१०००	१०	फिजिवल नभएको	मझौला तथा वैकल्पिक प्रविधिमा आधारित सिंचाइ योजना
२	सुनछहरी बाछेखोला कुलो निर्माण	१०००	१०	उद्देश्य संग मेल नभएको	
३	जबाङ भोर्ना सिंचाइ कुलो निर्माण रुन्टीगढी-३	१०००	१०	पानीको स्रोत नभएको	
४	सुलिचौर बसपार्क तटबन्ध निर्माण सुनिलस्मृति-२	२०००	१०	बजेट न्यून , बहुवर्षियमा जानु पर्ने	जलउत्पन्न प्रकोप न्यूनिकरण तथा व्यवस्थापन कार्यक्रम
५	चापाकोट भैंसीकाटिना जलाशय निर्माण तथा अर्धेरीखोला सिंचाइ योजना रोल्पा न पा ६	१०००	१०	अध्ययन नभएको	जलाशय निर्माण तथा पोखरी संरक्षण कार्यक्रम
६	चापाबोट भैंसीकाटिना अर्धेरी जलाशय निर्माण रोल्पा-६	१५००	१५००	अध्ययन नभएको । (बजेट रोक्का)	सिंचाइ योजना मर्मत सुधार तथा विस्तार कार्यक्रम
	जम्मा	७५००	१५५०		१५०० रोक्का

कार्यान्वयन हुन नसकेका आयोजनाहरुको विवरण

14



सुलिचौर बसपार्क तटबन्ध निर्माण सुनिलस्मृति-२
बजेट २० लाख



कार्यान्वयन हुन नसकेका आयोजनाहरुको विवरण

15



चापाबोट भैंसीकाटिना अंधेरी जलाशय निर्माण रोल्पा-६




Vertical Head 600 m

मिझिङ्ग लिफ्ट सिंचाइ योजना सुनिलस्मृति -३

कार्यान्यन हुन नसकेका आयोजनाहरुको विवरण

16

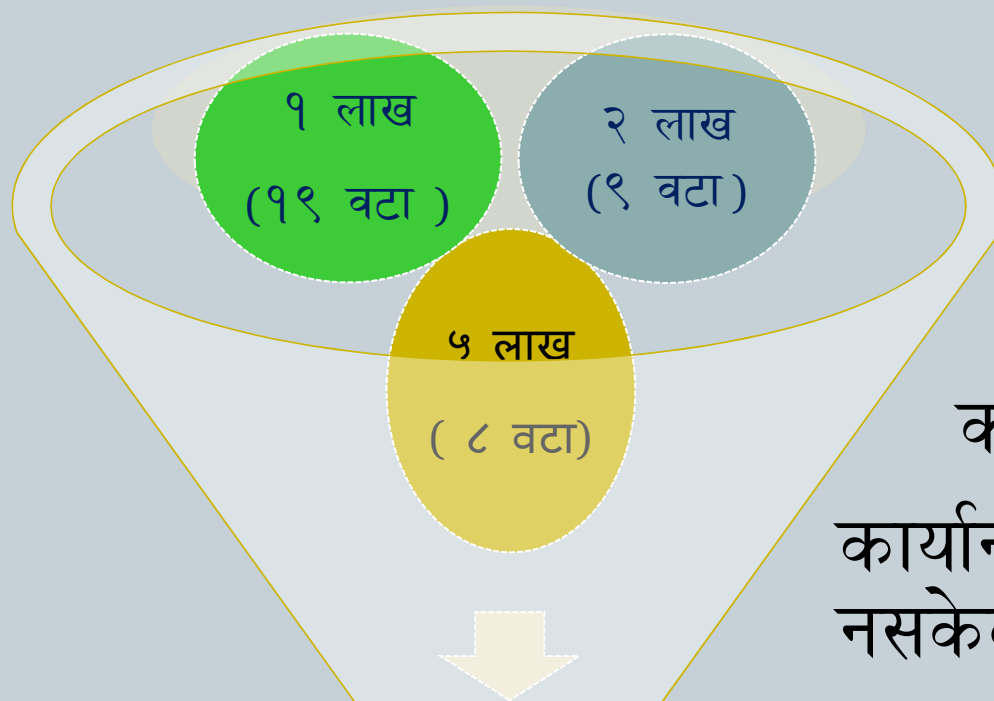

जम्मा	→ ५० →	३२२ लाख
फिर्ता	→ १० →	१९२ लाख
कार्यान्यन	→ ४ →	४७ लाख
		४० लाख
कार्यान्यन हुन नसकेका	→ ३६ →	८३ लाख
		० लाख

एकिकृत उर्जा तथा सिंचाइ विकास कार्यक्रम संघ शसर्त

कार्यक्रमगत खुद परिमाणात्मक वार्षिक प्रगति विवरण (सिंचाइ)

क्र. सं.	कार्यक्रमको नाम	सिंचाइ बाँध/मुहान	पक्की नहर/कुलो	लिफ्ट सिंचाइ	सिंचाइ पोखरी	पम्प हाउस	पाइप लाइनिङ	बिद्युति करण	थप सिंचाइ सुविधा पुगेको क्षेत्र	सिंचाइ संरचना सुदृढीकरण गरेको क्षेत्र	नदीमा नियन्त्रण (तटबन्ध निर्माण)	नदी नियन्त्रण बाट उकास भएको जमिन	तटबन्धबाट सुरक्षित भएको	
क	समानिकरण	वटा	कि.मी.	वटा	वटा	वटा	कि.मी.	वटा	हे.	हे.	कि.मी.	हे.	घर	हे.
१	मझौला तथा वैकल्पिक प्रविधिमा आधारित सिं	४	११.२९९	१	७	१	४.८८	-	८०	१२७	-	-	-	-
२	सिंचाइ आयोजना मर्मत सुधार तथा विस्तार	-	१.८५६	-	२	-	७.३१	-	८	३७	-	-	-	-
३	जल उत्पन्न प्रकोप न्यूनिकरण तथा व्यवस्थापन	-	-	-	-	-	-	-	-	-	२.००८	७.००	६३	१५२
४	जलासय निर्माण तथा पोखरी संरक्षण कार्यक्रम				५		३.४०							
समानिकरण जम्मा		४	१३.०८५	१	१४		१५.५९		८८	१६४	२.००८	७.००	६३	१५२

कार्यक्रमगत खुद परिमाणात्मक वार्षिक प्रगति विवरण (सिंचाइ)

क्र. सं.	कार्यक्रमको नाम	सिंचाइ बाँध/मुहान	पक्की नहर/कुलो	लिफ्ट सिंचाइ	सिंचाइ पोखरी	पम्प हाउस	पाइप लाइनिङ	विद्युति करण	थप सिंचाइ सुविधा पुगेको क्षेत्र	सिंचाइ संरचना सुदृढीकरण गरेको क्षेत्र	नदीमा नियन्त्रण (तटबन्ध निर्माण)	नदी नियन्त्रण बाट उकास भएको जमिन	तटबन्धबाट सुरक्षित भएको	
क	सशर्त	वटा	कि.मी.	वटा	वटा	वटा	कि.मी.	वटा	हे.	हे.	कि.मी.	हे.	घर	हे.
१	मझौला सिंचाइ योजना	१	२.३१५	-	-	-	-	-	-	१८	-	-	-	-
३	नदी नियन्त्रण	-	-	-	-	-	-	-	-	-	०.५१९	२.००	७	१२
४	नयाँ प्रविधिमा आधारित नदी नियन्त्रण	-	-	-	-	-	-	-	-	-	०.८८३	३.००	१	१९
४	मर्मत संभार	-	-	-	२	-	१.३४५	-	-	-	-	-	-	-
५	एकिकृत उर्जा विकास कार्यक्रम	-	१.४९८	-	-	-	-	-	९	१६	-	-	-	-
	सशर्त जम्मा	१	३.८१३		२		१.३४५		९	३४	१.४०२	५	८	३१
	कूल जम्मा (क)+(ख)	५	१६.९८९		१६		१६.९३५		९७	१९८	३.४१	१२	७१	१८३

आइपरेका समस्या सम्बन्धी विवरण

क्र. सं.	समस्या	समस्या समाधानका प्रयास	सुधारका उपाय
१	सडक पूर्वाधारको अव्यवस्थित निर्माणले गर्दा सिंचाइ कुलोमा अत्यधिक क्षति पुग्ने गरेको ।		सडक निर्माण गर्दा क्षतिहुने सिंचाइ योजनामा सोही निकायलाई जिम्मेवार बनाउन नितिगतरूपमै व्यवस्था गर्नु पर्ने ।



आइपरेका समस्या सम्बन्धी विवरण

20



सडक निर्माणक्रममा क्षति भएको भर्खर सम्पन्न गुनामखोला कालिजुङ धनचौर सिंचाइ योजना रुन्टीगढी १
रोल्पाको नहर

आइपरेका समस्या सम्बन्धी विवरण

21



भौगोलिक कठिनाइको कारण निर्माण सामाग्री ढुवानीमा कठिनाइ

आइपरेका समस्या सम्बन्धी विवरण

क्र. सं.	समस्या	समस्या समाधानका प्रयास	सुधारका उपाय
१	निर्माण कार्यको गुणस्तर परिक्षण (Lab Test) को लागि रुपन्देही र दाङ्ग स्थित सडक कार्यालय र निजि प्रयोगशालामा पठाउनु पर्ने भएकोले निकै कठिनाई भएको ।		कार्यालयमै आवश्यक जनशक्ति सहित प्रयोगशालाको व्यवस्था गर्नु पर्ने ।
२	सिचाइ कुलो मर्मत सम्बन्धि र जलउत्पन सम्बन्धि कार्यको माग अत्यधिक रहेकोमा कार्यालयबाट सम्बोधन गर्न नसकिएको ।		सिचाइ कुलो मर्मत सम्बन्धि र जलउत्पन सम्बन्धि कार्यको मागलाई सम्बोधन गर्न कार्यालयमै एकमुष्ट पर्याप्त बजेटको व्यवस्था गर्नु पर्ने ।
३	कर्मचारीका क्षमता वृद्धीका कार्यक्रम नहुदाँ कार्य प्रति Motivation नहुनु ।		मन्त्रालयमा समय समय मा विभिन्न तालिमको व्यवस्था गर्नु पर्ने ।
४	गैरलाभग्राही उपभोक्ता समिति, उपभोक्ता बाट ठेक्का लगाउने प्रविधि, नक्कली कागजात पेश, विमा, निर्माण पश्चातको उत्तरदाहित्व		मन्त्रालय स्तरबाट एकरूपता कायम ।

बेरुजु सम्बन्धी विवरण (प्रदेश कार्यालय स्थापना हुनु पूर्वको) रु.हजारमा

23

क्र सं	बेरुजु किसिम	जम्मा बेरुजु रकम (आ.ब.२०७४/७५ सम्म)	हाल सम्म फछ्यौट रकम	फछ्यौट %	कैफियत
१	असुल उपर गर्नु पर्ने	५०.५६५	२५.४७८	५०.३८%	
२	नियमित गर्नु पर्ने	८१४७.७९३	१३२८.३६२	१६.३०%	२२१६.५३९ सम्परिक्षणको लागि विभागमा पेश गरीएको ।
३	पेशकी	-	-		
	कूल जम्मा	८१९८.३५८	१३५३.८४	१६.५१%	


बेरुजु सम्बन्धी विवरण (प्रदेश कार्यालय स्थापना पछिको)

रु.हजारमा

24

क्र सं	बेरुजु किसिम	जम्मा बेरुजु रकम (आ.ब.२०७८/७९सम्म)	हाल सम्म फछ्यौट रकम	फछ्यौट %	कैफियत
१	असुल उपर गर्नु पर्ने	७८.६३१	६१.३७२	७८.०५ %	
२	नियमित गर्नु पर्ने	४७५.१८१	३५९.७५८	७५.७०%	
३	पेशकी	४९३६.००	४९३६.००	१०० %	
	कूल जम्मा	५४८९.८१२	५३५७.१३	९७.५८%	

कार्यान्वयनमा ल्याइएका राम्रा अवधारणाहरु (Good Practices)



वेबसाइट निर्माण तथा अपडेट

आ. व. ०७९।८० को कार्यालयको प्रोफाइल तयार (तिन बर्षको गतिविधि लाई समेटिएको)

कार्यान्वयनमा ल्याइएका राम्रा अवधारणाहरु (Good Practices)



प्रमुख जिल्ला अधिकारी ज्यू को प्रमुख आथित्यमा ठेक्का म्याद भन्दा अगावै कार्य सम्पन्न गर्ने निर्माण व्यवसायिलाई सम्मान गरिदै । आ. व. ०७८।७९

कार्यान्वयनमा ल्याइएका राम्रा अवधारणाहरू (Good Practices)


27



प्रमुख जिल्ला अधिकारी ज्यू को प्रमुख आतिथ्यमा ठेक्का म्याद भन्दा अगावै कार्य सम्पन्न गर्ने निर्माण व्यवसायिलाई सम्मान गरिदै । आ. व. ०७९।८०


आ.व.०७९/८० को वार्षिक प्रगति सारांश कार्यालय र स्थानिय तह

यस आ. व. मा विभिन्न कार्यालयबाट सिंचाइ योजनामा विनियोजन रकम र खर्च (रु हजारमा)

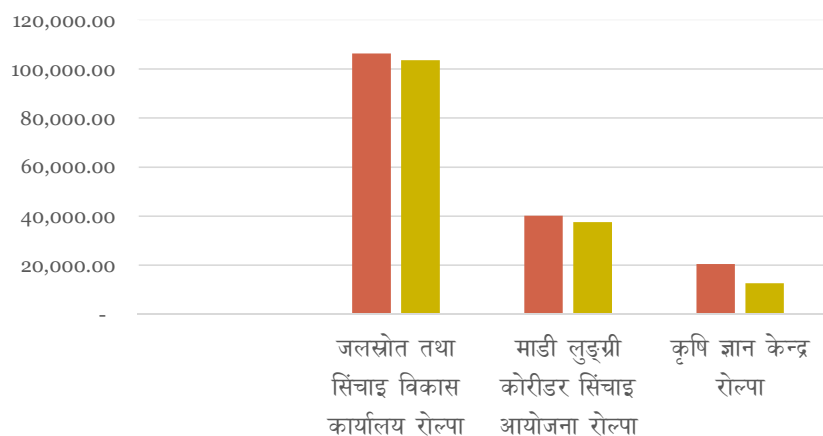

■ आ व ०७९/८० मा विनियोजन बजेट रु. हजारमा ■ आ व ०७९/८० मा खर्च रकम रु. हजारमा

यस आ. व. मा विभिन्न स्थानियतहबाट सिंचाइ योजनामा विनियोजन रकम र खर्च (रु हजारमा)

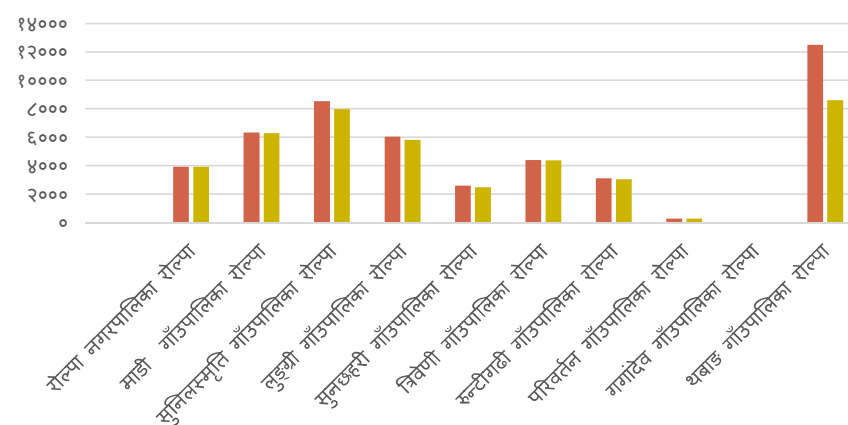

■ आ व ०७९/८० मा विनियोजन बजेट रु. हजारमा ■ आ व ०७९/८० मा खर्च रकम रु. हजारमा


कार्यालयहरुको जम्मा विनियोजित रकम रु : १६७२४९.९४

स्थानियतह हरुको जम्मा विनियोजित रकम रु : ४७८६०.००


कार्यालयहरुको जम्मा खर्च रकम रु : १५३९८६.८८

स्थानियतह हरुको जम्मा खर्च रकम रु : ४२९७९.५९

आ.व.०७९/८० को वार्षिक प्रगति सारांश संघसंस्थाहरु

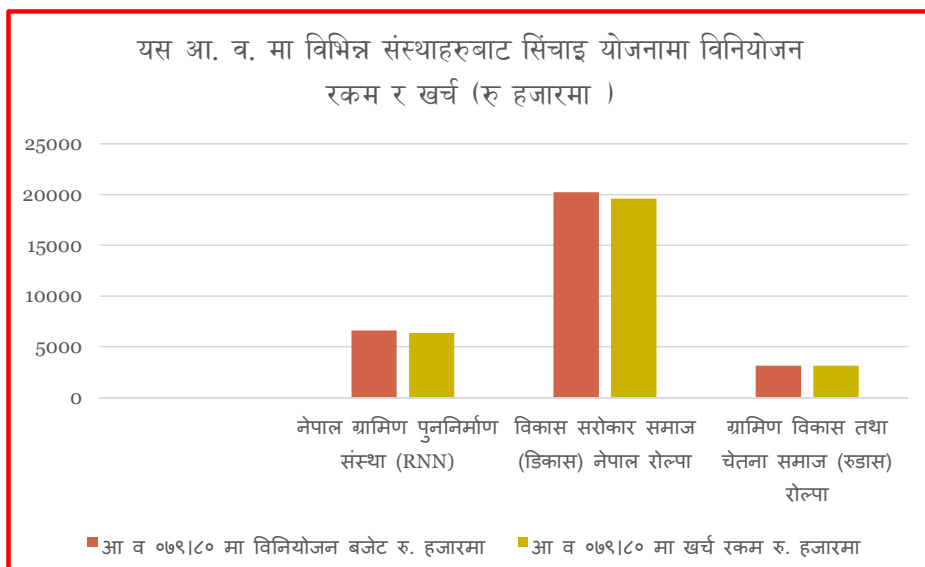

कार्यक्रमगत खुद परिमाणात्मक वार्षिक प्रगति विवरण

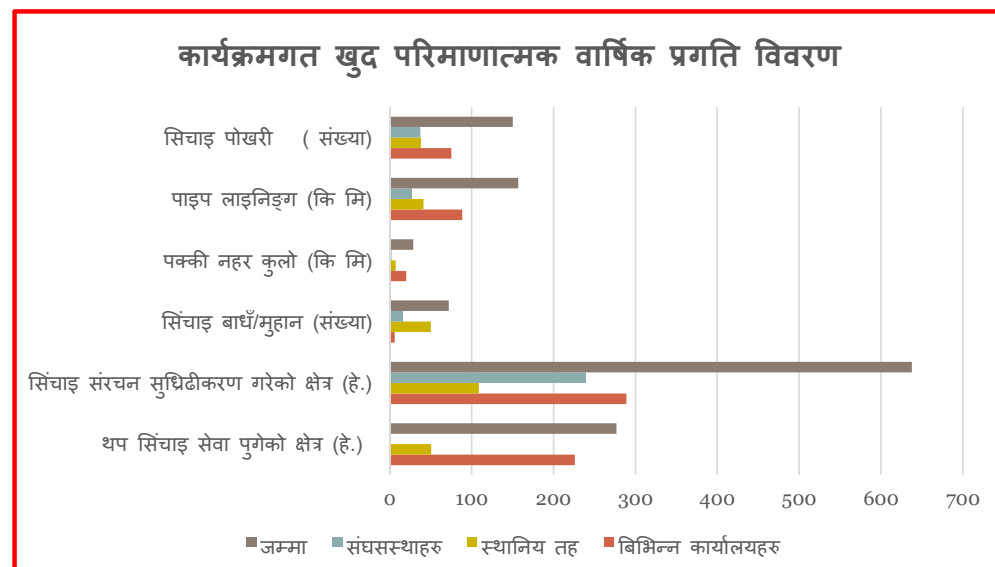


कार्यालयहरुको जम्मा विनियोजित रकम रु : ३०००६.६६


कार्यालयहरुको जम्मा खर्च रकम रु : २९१२२.७३४

	थप सिंचाइ सेवा पुगेको क्षेत्र (हे.)	सिंचाइ संरचन सुध्दिीकरण गरेको क्षेत्र (हे.)	सिंचाइ बाध/मुहान (संख्या)	पक्की नहर कुलो (कि मि)	पाइप लाइनिङ (कि मि)	सिंचाइ पोखरी (संख्या)
बिभिन्न कार्यालयहरु	२२६	२८९	६	१९.८९८	८८.५३९	७५
स्थानिय तह	५०.५५	१०८.७६	५०	६.८७१	४१.२५४	३८
संघसंस्थाहरु	०	२३९.६६	१६	१.९१	२६.८३	३७
जम्मा	२७६.५५	६३७.४२	७२	२८.६७९	१५६.६२३	१५०

पछिल्लो तिन वर्षको कार्यालयको विनियोजन र खर्च

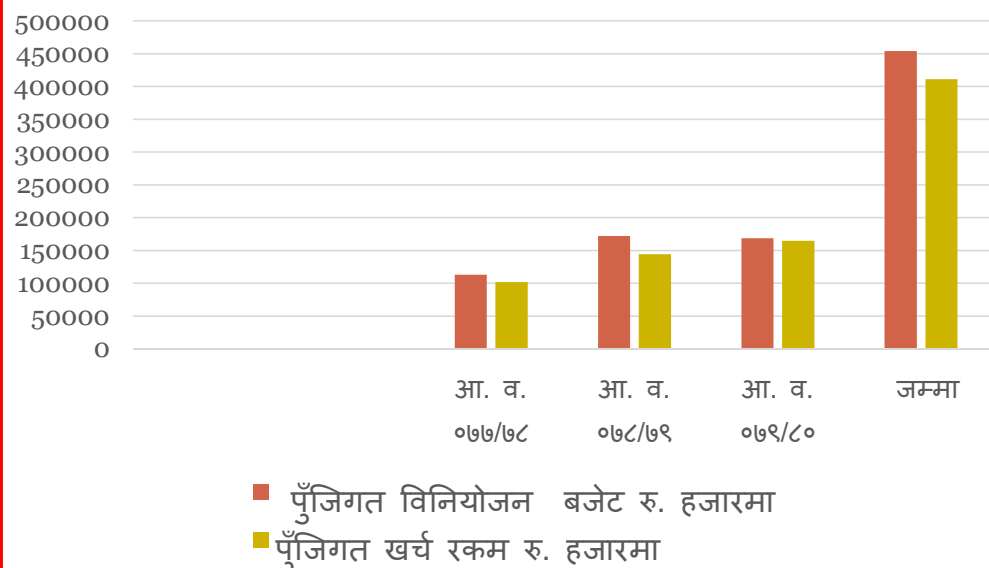

पछिल्लो तिन वर्षको सिंचाइमा भएको सुधार

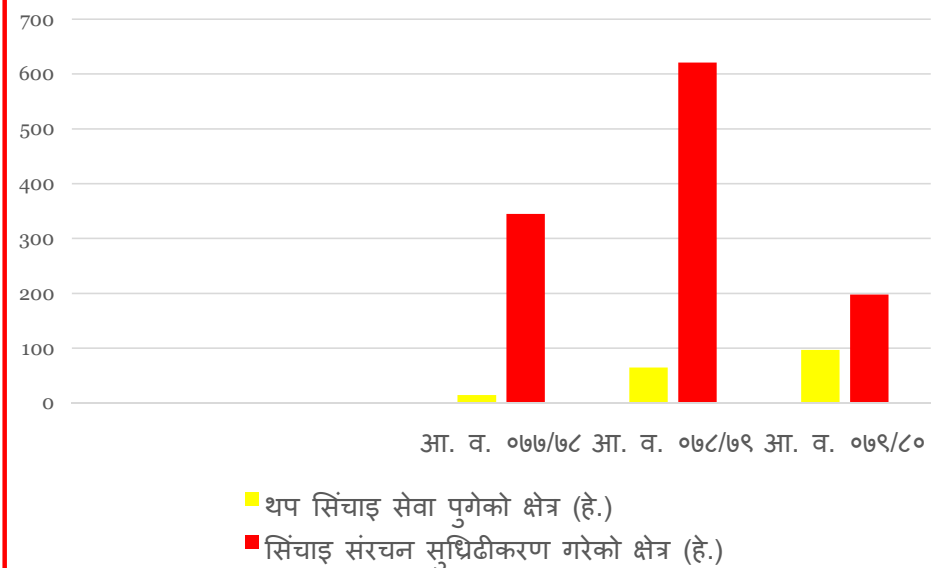

सि. न.	आर्थिक वर्ष	पुँजिगत विनियोजन बजेट रु. हजारमा	पुँजिगत खर्च रकम रु. हजारमा
१	आ. व. ०७७/७८	११३४०४.००	१०२१६५.००
२	आ. व. ०७८/७९	१७२२००.००	१४४३३८.७९४
३	आ. व. ०७९/८०	१६८९८३.२९५	१६५०१२.०१०
	जम्मा	४५४५८७.२९५	४११६१५.८०४

थप सिंचाइ सेवा पुगेको क्षेत्र (हे.)	सिंचाइ संरचन सुध्दिीकरण गरेको क्षेत्र (हे.)
१५	३४५
६५	६२१
९७	१९८
१७७	११६४

केही स्थलगत फोटोहरू

आयोजना कार्यान्वयन अवस्थाका फोटोहरु

32



Desalting Basin



Pipe lining

चिउरीधारा सिंचाइ योजना रोल्पा १० रोल्पा

आयोजना कार्यान्वयन अवस्थाका फोटोहरु

33



चिउरीधारा सिंचाइ योजना रोल्पा १० रोल्पा

RVP : 6 No
Capacity :

आयोजना कार्यान्वयन अवस्थाका फोटोहरु

24



मनगाड सिंचाइ योजना सुनिलस्मृति ५ रोल्पा

आयोजना कार्यान्वयन अवस्थाका फोटोहरु



सालघारी सिंचाइ योजना रोल्पा ४ रोल्पा

आयोजना कार्यान्वयन अवस्थाका फोटोहरु



पाखाखर्क रन्टबाझ सिंचाइ योजना रोल्पा ४ रोल्पा

आयोजना कार्यान्वयन अवस्थाका फोटोहरु

37



गुरुङ्गाँउ लिफ्ट सिंचाइ योजना रोल्पा ४ रोल्पा

आयोजना कार्यान्वयन अवस्थाका फोटोहरु

38

Transformer



Pump House



Storage tank near Intake



RVP



Lifting of water



दबसे लिफ्ट सिंचाइ योजना लुङ्ग्री २ रोल्पा

आयोजना कार्यान्वयन अवस्थाका फोटोहरु

Intake before Construction



After Construction



लखना सिंचाइ योजना रुन्टीगढी ३ रोल्पा

Intake before Construction



आयोजना कार्यान्वयन अवस्थाका फोटोहरु

40

Before Construction



After Construction



भूमिगत जल पुनर्भरण कार्यक्रम दयाथाम पोखरी संरक्षण
कार्य थवाङ ३ रोल्पा

आयोजना कार्यान्वयन अवस्थाका फोटोहरु

41



सिबाङ्ग खोला तटबन्ध त्रिवेणी ५ रोल्पा

आयोजना कार्यान्वयन अवस्थाका फोटोहरु

42



स्याङखोला तटबन्ध योजना सुनछहरी ३ रोल्पा



वालकल्याण आधारभू विधालय पहिरो संरक्षण परिवर्तन १

आयोजना कार्यान्वयन अवस्थाका फोटोहरु

43



आराङ्ग खोला तटबन्ध कार्य रुन्टीगढी ३ रोल्पा



आराङ्ग खोला तटबन्ध कार्य रुन्टीगढी ३ रोल्पा

आयोजना कार्यान्वयन अवस्थाका फोटोहरु

45



पाछावाङ् खोला तटबन्ध परिवर्तन ३ रोल्पा

आयोजना कार्यान्वयन अवस्थाका फोटोहरु

46



प्रमुख जिल्ला अधिकारी, प्रमुख कोष नियन्त्रक लगायत बाट
मनघाट सिंचाइ योजना सुनिलस्मृति ५ रोल्पाको अनुगमन



प्रमुख जिल्ला अधिकारी, प्रमुख कोष नियन्त्रक लगायत बाट
देउखुरीखोला गुदुमसेरा सिंचाइ योजना सुनिलस्मृति २ रोल्पाको
अनुगमन

आयोजना कार्यान्वयन अवस्थाका फोटोहरु

47



लुम्बिनी प्रदेश सरकार भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय प्रशासन शाखा प्रमुख, इन्जिनियर र कानुन अधिकृत बाट सालघारी सिंचाइ योजनाको रोल्पा ४, रोल्पा को अनुगमन

आयोजना कार्यान्वयन अवस्थाका फोटोहरु

48

मनगाड सिं यो सुनिलस्मृति ५ रोल्पा



गुनामखोला कालिजंग धनचौर सिं यो सुनिलस्मृति ५ रोल्पा



आयोजना कार्यान्वयनमा आएका समस्या समाधानको लागि ज. उ. स. सँग छलफल

आयोजना कार्यान्वयन अवस्थाका फोटोहरु

कान्छीकुलो सिं यो गुल्मी



पँहिलाखोला सिं यो रुपन्देही



अर्गेली सिं यो पाल्पा



कान्छीकुलो सिं यो गुल्मी



वाडगगां सिं यो कपिल्वस्तु



चौउवाफाँट सिं यो अर्घाखाँची



संस्थागत विकास अन्तर्गत रोल्पा जिल्लाका विभिन्न ज. उ. स. का पदाधिकारी तथा कृषकहरुलाई कपिल्वस्तु, रुपन्देही, पाल्पा गुल्म र अर्घाखाँचिका विभिन्न सिंचाइ योजनाका पदाधिकारी तथा कृषकहरुसँग छलफल सँगै लिएका विभिन्न तस्विरहरु

आयोजना कार्यान्वयन अवस्थाका फोटोहरु



जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट कार्यालयलाई
सम्मान। मिति २०७९।०९।१३

उत्कृष्ट जल उपभोक्ता संस्थाको रुपमा गुनामखोला
कार्लिजंग धनचौर सिचाइ ज.उ.स.,रोल्पा सम्मानित
भए पश्चात माननिय मन्त्रीज्यू सगैँ लिएको तस्विर

आभारी छु

- माननिय मन्त्रिज्यू , सचिवज्यू, महाशाखा प्रमुखज्यूहरु र मन्त्रालयको सम्पूर्ण टिम
- कार्यालयका सम्पूर्ण कर्मचारी साथिहरु
- जिल्ला स्थित सम्पूर्ण सरोकार कार्यालय प्रमुखज्यूहरु

धन्यवाद !
