



मन्त्रालयस्तरीय आ.व.०७९/८० को
अर्धवार्षिक प्रगति समीक्षा-२०७९

1

मिति :- २०७९ फाल्गुन १४ र १५ गते

स्थान: भौतिक पूर्वाधार विकास

मन्त्रालयको सभाहल, राप्ति

प्रस्तुतकर्ता:

नि.डि.प्र. श्री भेष राज भुसाल

जलस्रोत तथा सिंचाई विकास डिभिजन

कार्यालय

रोल्पा

कृषिको आधार : सिंचाइमा सुधार

प्रस्तुती सूची

2

- कार्यालयको जनशक्ति अवस्था
- कार्यालयको समग्र वित्तीय तथा भौतिक प्रगति अवस्था
- बजेटको श्रोतगत प्रगति अवस्था
- योजना कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या, प्रयास तथा उपायहरू
- बेरुजु तथा सम्परीक्षणको अवस्था
- केही राम्रा अभ्यास तथा सूचना प्रविधिको उपयोग
- केही स्थलगत फोटोहरू

कार्यालयको समष्टिगत जनशक्ति विवरण

क्र.सं.	सेवा	स्वीकृत दरबन्दी			पदपूर्ति	स्थायी रिक्त दरबन्दी	कैफियत
		स्थायी	अस्थायी	जम्मा			
१	प्राविधिक	७	-	७	३	४	
२	प्रशासनिक	४	१	५	४	१	कार्यालय सहयोगी समेत गरि
	कूल	१२	१	१२	७	५	

पदपूर्ति र रिक्त विवरण

क्र.सं.	पद	सेवा	समूह	उप-समूह	तह/श्रेणी	स्वीकृत			पदपूर्ति		रिक्त	कै.
						स्थायी	अस्थायी	जम्मा	स्थायी	करार/ज्या.		
१	सि.डि.ई.	इन्जि.	सिभिल	ईरिगेशन	अधिकृत नवौं/दशौं	१	-	१	-	-	१	
२	इन्जिनियर	इन्जि.	सिभिल	सिंचाइ	अधिकृत सातौं/आठौं	२	-	२	१	-	१	
३	सहायक/अधिकृत	प्रशासन	सा.प्र.		स.पाँचौं/अ.छैटौं	१	-	१	१	-	-	
४	सहायक/अधिकृत	प्रशासन	लेखा		स.पाँचौं/अ.छैटौं	१	-	१	-	-	१	
५	सब.ई./अधिकृत	इन्जि.	सिभिल	सिंचाइ	स.पाँचौं/अ.छैटौं	३	-	३	२	-	१	
६	ए.ओ.				स.पाँचौं/अ.छैटौं	१	-	१	-	-	१	
७	ह.स.चा.					-	१	१	-	१	-	
८	का.स.					२	-	२	१	१	-	
	जम्मा					१२	-	१२	५	२	५	

पदपूर्ति र रिक्त विवरण

क्र.सं.	कर्मचारीको नाम	पद	सेवा	समूह/उप-समूह	तह/श्रेणी	हालको कार्यालयमा पदस्थापन वा काज	हालको कार्यालयमा सरुवा मिति	हालको कार्यालयपूर्व रहेको कार्यालयको नाम	शैक्षिक योग्यता	कै.
१	भेषराज भुसाल	इन्जिनियर नि डिभिजन प्रमुख	इन्जि.	सिभिल/इरिगेशन	सातौं तह	पदस्थापना	२०७७।११।१०	ज तथा सिं वि डि का रुपन्देही	ME	
२	राजकुमार सापकोटा	अधिकृत छैठौं	इन्जि.	सिभिल/इरिगेशन	छैठौं तह	पदस्थापना	२०७८।०६।१५	ज तथा सिं वि डि का रुपन्देही	BE	
३	किसनजी कुवर	सब इन्जिनियर	इन्जि.	सिभिल/इरिगेशन	पाचौं तह	पदस्थापना	२०७३।०८।१५	शुरु नियुक्ति	BE	
४	श्यामलाल रावत	ना सु	प्रशासन	सा. प्रशासन	पाचौं तह	कामकाज	२०७५।०८।२८	श वि तथा भवन डि का रोल्पा	SLC	
५	तिलकराम के सी	का स	प्रशासन	सा. प्रशासन	श्रेणी बिहिन	पदस्थापना	२०७५।०८।०२	जिल्ला भू संरक्षण कार्यालय रोल्पा		
६	ओम प्रकास खड्का	का स	प्रशासन	सा. प्रशासन	श्रेणी बिहिन	करार				
७	खुम बहादुर के सी	ह स चा	इन्जि	मेकानिकल	श्रेणी बिहिन	करार				

आ.व.०७९/८० को अर्धवार्षिक प्रगति सारांश

रु.हजारमा

क्र.सं	बजेट शिर्षक	वार्षिक विनियोजन	अर्ध वार्षिक खर्च	खर्च (%)	कैफियत
१	चालु	९९७९	३२६६.९०१	३२.७३	
२	पूँजीगत	२००१०० (१८३१००)	४८१०८.४२७	२४.०४	२६.२७
	कूल जम्मा	२१००७९.००	५१३७५.३२८	२४.४५	२६.६०

आयोजना कार्यान्वयनको अवस्था (सिंचाइ)

सि.नं.	कार्यक्रमको नाम	आयोजनाहरूको कार्यान्वयन अवस्था (संख्या)					कैफियत
		कूल	खरिद प्रक्रियामा	कार्यान्वयन भैरहेका	यस आ.व.को हालसम्म सम्पन्न भएका	कार्यान्वयन हुन नसकेका	
क	समानिकरण						
१	मझौला तथा वैकल्पिक प्रविधिमा आधारित सिंचाइ आयोजना	२२	२	१५	४	१	
२	सिंचाई आयोजना मर्मत सुधार तथा विस्तार कार्यक्रम	२२	-	२०	२	०	
३	जल उत्पन्न प्रकोप न्यूनिकरण तथा व्यवस्थापन कार्यक्रम	२६	-	१७	४	५	
४	जलासय निर्माण तथा पोखरी संरक्षण कार्यक्रम	६		४	१	१	
	समानिकरण जम्मा	७६	२	५६	११	८	
ख	सशर्त						
१	मझौला सिंचाइ आयोजना	३	-	३	०	-	
२	मर्मत सुधार आयोजना	१	-	-	१	-	
३	नदी नियन्त्रण	९		८	१	-	
४	नयाँ प्रविधिमा आधारित नदी नियन्त्रण	१३		१०	३		
५	एकिकृत उर्जा तथा सिंचाइ विकास कार्यक्रम	५०		४	-	३६	१० वटा फिर्ता
	सशर्त जम्मा	७६	०	२५	४	३६	
	कूल जम्मा (क)+(ख)	१५२	२	८१	१५	४४	

कार्यान्वयनमा रहेका योजनाहरुको समष्टिगत भौतिक प्रगति

क्र.सं.	कार्यक्रमको नाम	कूल आयोजनाहरुको संख्या	>८०% प्रगति भएको संख्या	५०-८०% प्रगति भएको संख्या	<५०% प्रगति भएको संख्या	कार्यान्वयन हुन नसकेका
क	समानिकरण					
१	मझौला तथा वैकल्पिक प्रविधिमा आधारित सिंचाइ आयोजना	२२	१३	६	४	१
२	सिंचाई आयोजना मर्मत सुधार तथा विस्तार	२२	७	५	१०	१
३	जल उत्पन्न प्रकोप न्यूनिकरण तथा व्यवस्थापन	२६	१०	३	८	५
४	जलासय निर्माण तथा पोखरी संरक्षण कार्यक्रम	६	२	१	२	१
	समानिकरण जम्मा	७६	३२	१५	२४	७
ख	सशर्त					
१	मझौला सिंचाइ आयोजना	३		१	२	-
२	मर्मत सुधार आयोजना	१	१			-
३	नदी नियन्त्रण	९	१	५	३	-
४	नयाँ प्रविधिमा आधारित नदी नियन्त्रण	१३	७	२	४	
५	एकिकृत उर्जा तथा सिंचाइ विकास कार्यक्रम	४०	१	१	२	३६
	संघ शसर्त अनुदान तर्फका कार्यक्रमहरु	६६	१०	९	११	३६
	कूल जम्मा	१४२	४२	२४	३५	४३

बजेटको श्रोत अनुसार प्रगति विवरण

रु.हजारमा

सि. नं.	बजेटको श्रोत	जम्मा आयोजना संख्या	वार्षिक विनियोजन	अर्धवार्षिक खर्च	अर्धवार्षिक प्रगति		कार्यान्वयनमा गएका आयोजना संख्या	सम्पन्न भएका आ. संख्या	कैफियत
					भौतिक (%)	वित्तीय (%)			
१	समानीकरण/ राजश्व अनुदान	७६	१२७९००.००	४०५०२.६४६	५०	३१.६६	६८	११	
२	सशर्त अनुदान	६६	५५२००.००	४७०५.६३२	४५	१७.२६	२९	४	
	जम्मा	१४२	१७२२००.००	१६४४३८.७९४	९९	९५.४९	११८	१०९	

कार्यक्रमगत प्रगति विवरण (सिंचाइ)

रु.हजारमा

क्र. सं.	कार्यक्रमको नाम	वार्षिक बजेट	अर्धवार्षिक खर्च	अर्धवार्षिक प्रगति		कैफियत
				भौतिक(%)	वित्तीय(%)	
क	समानिकरण					
१	मझौला तथा वैकल्पिक प्रविधिमा आधारित सिंचाइ आयोजना	७१७००.००	२६१०८.३२७	६०	३६.४१	
२	सिंचाइ आयोजना मर्मत सुधार तथा विस्तार	१२५००.००	९५६.५९२	४०	७.६५	
३	जल उत्पन्न प्रकोप न्यूनिकरण तथा व्यवस्थापन	३६५००.००	१२१५३.३६७	५५	३३.६२९	
४	जलासय निर्माण तथा पोखरी संरक्षण कार्यक्रम	६५००.००	९९५.४६१	४०	१५.३१	
	समानिकरण जम्मा	१२७२००.००	४०२१३.७४७	४८	३१.६१	
ख	सशर्त					
१	मझौला सिंचाइ आयोजना	११०००.००	१३७५.३८२	३०	१२.५०	
२	मर्मत सुधार आयोजना	१०००.००	९५३.०४२	१००	९५.३०	
३	नदी नियन्त्रण	९५००.००	१९२५.८५५	४०	२०.२७	
४	नयाँ प्रविधिमा आधारित नदी नियन्त्रण	१८५००.००	३३५१.३५३	४०	१८.११	
५	एकिकृत उर्जा तथा सिंचाइ विकास कार्यक्रम	१५२००.००	००.००	२०	००.००	
	सशर्त जम्मा	५५२००.००	७६०५.६३२	४६	१३.७७	
	कूल जम्मा (क)+(ख)	१८२४००.००	४७८१९.३७९	४७	२६.२१	

मुख्य-मुख्य आयोजनाहरुको प्रगति विवरण

रु.हजारमा

क्र. सं.	कार्यक्रमको नाम	वार्षिक बजेट	अर्धवार्षिक खर्च	हाल सम्मको खर्च	अर्धवार्षिक प्रगति		कैफियत
					भौतिक(%)	वित्तीय(%)	
क	कार्यक्रमको नाम						
१	घान्टुखोला सिं यो रोल्पा २	१०००	९६९.३९	१४००२	१००	९६.९३	ठेक्का सम्पन्न
२	चिउरीधारा सिं यो रोल्पा १०	८०००	२९६७.२९	२४३३६	९५	३७.०८	ठेक्का सम्पन्न
३	दबसे लिफ्ट सिं यो लुङ्ग्री २	४०००	११५५.७६	३८८४	६०	२८.८७	क्रमागत
४	धम्पाखोला हरिगाँउ महेन्द्री सिं यो सुनिलस्मृति २	१८०००	६६०२.९२	८६२२.९२	४५	३६.६८	क्रमागत
५	गुनामखोला कालिजङ् धनचौर सिं यो रुन्टीगढी १	९०००	२८४५.३७	३९६५.३७	६०	४४.०५	क्रमागत
६	मनगाड सिं यो सुनिलस्मृति ५	९२००	८०६९.१३	९९९२	९०	८७.७०	क्रमागत
७	झागरखोला सिं यो त्रिवेणी ५	२०००	००	८४०५	९०	००.००	ठेक्का सम्पन्न

कार्यान्वयन हुन नसकेका आयोजनाहरुको विवरण

क्र.सं.	आयोजनाहरुको नाम	वार्षिक विनियोजन (रु.हजारमा)	कार्यान्वयन हुन नसक्नुका कारण	कैफियत
१	मिझिङ लिफ्ट सिंचाइ योजना सुनिलस्मृती	१०००	अध्ययन नभएको ।	
२	चापाकोट भैंसीकाटिना जलाशय निर्माण तथा अंधेरीखोला सिंचाइ योजना रोल्पा न पा ६	१५००	अध्ययन नभएको ।	
३	खुरखुरीखोला तटबन्ध निर्माण गंगादेव गापा रोल्पा	१०००	बिवाद रहेको ।	
४	सुलिचौर बसपार्क तटबन्ध निर्माण सुनिलस्मृति-२	२०००	अति न्यून बजेट भएकोले कार्य अगाडी नबढेको ।	
५	नाफे चावङ खोला तटबन्ध परिवर्तन ६	१०००	बिवाद रहेको ।	
६	देउखुरीखोला तटबन्ध सुनिलस्मृती २	१०००	बिवाद रहेको ।	
७	चापाबोट भैंसीकाटिना अंधेरी जलाशय निर्माण रोल्पा-६	१०००	अध्ययन नभएको ।	
८	एकिकृत उर्जा तथा सिंचाइ विकास कार्यक्रम	१०५००	अति न्यून बजेट भएको ।	
	जम्मा	१९०००		

कार्यान्वयन हुन नसकेका आयोजनाहरुको विवरण

13



सुलिचौर बसपार्क तटबन्ध निर्माण सुनिलस्मृति-२
बजेट २० लाख



कार्यान्वयन हुन नसकेका आयोजनाहरुको विवरण

14



चापाबोट भैंसीकाटिना अंधेरी जलाशय निर्माण रोल्पा-६




Vertical Head 600 m

मिझिङ्ग लिफ्ट सिंचाइ योजना सुनिलस्मृति -३

कार्यान्यन हुन नसकेका आयोजनाहरुको विवरण

15

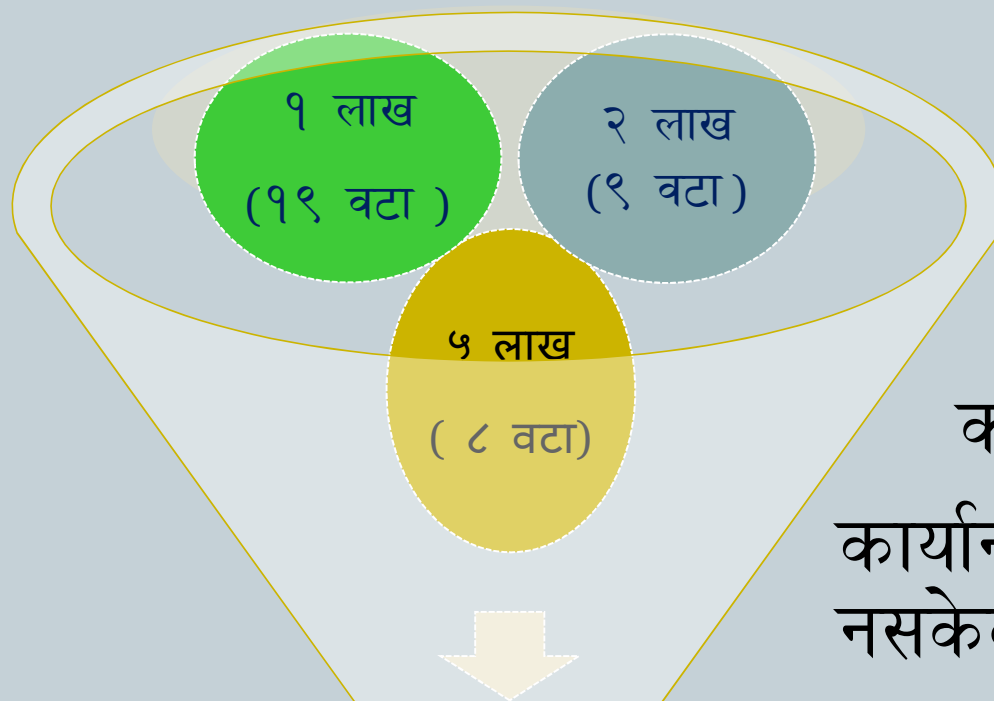

जम्मा → ५० → ३२२ लाख

फिर्ता → १० → १७० लाख

कार्यान्यन → ४ → ४७ लाख

कार्यान्यन हुन
नसकेका → ४ → १०५ लाख

एकिकृत उर्जा तथा सिंचाइ विकास कार्यक्रम संघ शसर्त

आइपरेका समस्या सम्बन्धी विवरण

क्र. सं.	समस्या	समस्या समाधानका प्रयास	सुधारका उपाय
१	सडक पूर्वाधारको अव्यवस्थित निर्माणले गर्दा सिंचाइ कुलोमा अत्यधिक क्षति पुग्ने गरेको ।		सडक निर्माण गर्दा क्षतिहुने सिंचाइ योजनामा सोही निकायलाई जिम्मेवार बनाउन नितिगतरूपमै व्यवस्था गर्नु पर्ने ।



आइपरेका समस्या सम्बन्धी विवरण

क्र. सं.	समस्या	समस्या समाधानका प्रयास	सुधारका उपाय
१	निर्माण कार्यको गुणस्तर परिक्षण (Lab Test) को लागि रुपन्देही र दाङ्ग स्थित सडक कार्यालय र निजि प्रयोगशालामा पठाउनु पर्ने भएकोले निकै कठिनाई भएको ।		कार्यालयमै आवश्यक जनशक्ति सहित प्रयोगशालाको व्यवस्था गर्नु पर्ने ।
२	सिचाइ कुलो मर्मत सम्बन्धि र जलउत्पन सम्बन्धि कार्यको माग अत्यधिक रहेकोमा कार्यालयबाट सम्बोधन गर्न नसकिएको ।		सिचाइ कुलो मर्मत सम्बन्धि र जलउत्पन सम्बन्धि कार्यको मागलाई सम्बोधन गर्न कार्यालयमै एकमुष्ट पर्याप्त बजेटको व्यवस्था गर्नु पर्ने ।
३	कर्मचारीका क्षमता वृद्धीका कार्यक्रम नहुदाँ कार्य प्रति Motivation नहुनु ।		मन्त्रालयमा समय समय मा विभिन्न तालिमको व्यवस्था गर्नु पर्ने ।
४	गैरलाभग्राही उपभोक्ता समिति , उपभोक्ता बाट ठेक्का लगाउने प्रविधि, नक्कली कागजात पेश, विमा, निर्माण पश्चातको उत्तरदाहित्व		मन्त्रालय स्तरबाट एकरूपता कायम ।

बेरुजु सम्बन्धी विवरण (प्रदेश कार्यालय स्थापना हुनु पूर्वको) रु.हजारमा

18

क्र सं	बेरुजु किसिम	जम्मा बेरुजु रकम (आ.ब.२०७४/७५ सम्म)	हाल सम्म फछ्यौट रकम	फछ्यौट %	कैफियत
१	असुल उपर गर्नु पर्ने	५०.५६५	२५.४७८	५०.३८%	
२	नियमित गर्नु पर्ने	८१४७.७९३	१३२८.३६२	१६.३०%	२२१६.५३९ सम्परिक्षणको लागि विभागमा पेश गरीएको ।
३	पेशकी	-	-		
	कूल जम्मा	८१९८.३५८	१३५३.८४	१६.५१%	

बेरुजु सम्बन्धी विवरण (प्रदेश कार्यालय स्थापना पछिको)

रु.हजारमा

19

क्र सं	बेरुजु किसिम	जम्मा बेरुजु रकम (आ.ब.२०७८/७९सम्म)	हाल सम्म फछ्यौट रकम	फछ्यौट %	कैफियत
१	असुल उपर गर्नु पर्ने	७८.६३१	६१.३७२	७८.०५ %	
२	नियमित गर्नु पर्ने	४७५.१८१	३५९.७५८	७५.७०%	
३	पेशकी	४९३६.००	४९३६.००	१०० %	
	कूल जम्मा	५४८९.८१२	५३५७.१३	९७.५८%	

कार्यान्वयनमा ल्याइएका राम्रा अवधारणाहरु (Good Practices)



प्रदेश सरकार
लुम्बिनी प्रदेश
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालय

जलस्रोत तथा सिंचाइ विकास डिभिजन कार्यालय
रोल्पा, नेपाल

जलस्रोत तथा सिंचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, रोल्पा
आज मिति: २०७१, श्रावण ०३ गते सोँरा ०७:५६:५२

हाम्रो बारेमा ▾ सूचना पाटी ▾ प्रगति विवरण ऐन तथा नियम ▾ डाउनलोड ▾ मिडिया सेन्टर ▾ सम्पर्क

ताजा जानकारी: ल्पा जिल्लाको ०७९१/८० को जिल्ला दर्रेट | समान तथा मझौला सिंचाइ योजना माग गर्दा कुषकले भर्नु पर्ने फारम | नगरिक वडापत्र | जलस्रोत तथा सिंचाइ विकास डिभिजन कार्यालय



परिचय

बि.सं. २०७५ साल देखि सिंचाइ विभाग अन्तर्गत जिल्ला सिंचाइ कार्यालय रोल्पाको स्थापना भएको हो । स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०७२ जारी भइ लागु भए पछि वि.सं. २०५८ मा सिंचाइ विभागको संरचनात्मक फेरबदल भए पश्चात् २०७२ सम्म रोल्पा जिल्लामा सिंचाइ सम्बन्धि योजनाहरु मध्यपश्चिमाञ्चल सिंचाइ विकास डिभिजन कार्यालय नं ४ प्युठान र जलउत्पन्न सम्बन्धि योजनाहरु जलउत्पन्न प्रकोप नियन्त्रण सस डिभिजन कार्यालय नं. ३ दाङ्ग बाट हुँदै आएकोमा बि.सं. २०७२ साल भाद्र देखी मध्य पश्चिमाञ्चल क्षेत्रिय सिंचाइ निर्देशनालय अन्तर्गत सिंचाइ विकास डिभिजन कार्यालय रोल्पाको स्थापना भई सिंचाइ सम्बन्धि कार्यहरु हुँदै आएका थिए । जलउत्पन्न प्रकोप व्यवस्थापन सम्बन्धि कार्यहरु जल उत्पन्नप्रकोप व्यवस्थापन डिभिजन प्युठान बाट हुँदै आएका थिए ।

नेपालको संविधान, २०७२ ले परिष्कृत गरे अनुसार जलस्रोत, सिंचाइ तथा जल उत्पन्न प्रकोप व्यवस्थापन सम्बन्धि केन्द्रिय स्तरमा ठुला आयोजना तथा परियोजनाहरु, अन्तर प्रदेशिय बहुउपयोगि आयोजनाहरु, अन्तरदेशिय सरोकार रहने बहुउद्देश्यीय आयोजनाहरुको तर्जुमा, नीति निर्माण, कार्यान्वयन तथा अनुगमनमा संघबाट गर्नुपर्ने कार्यहरुको लागि साविकका सिंचाइ विभाग र जलउत्पन्न प्रकोप व्यवस्थापन विभाग खारिज भई बि.सं. [डा. रणधुमि](#)



श्री रमेश भुसाल
प्रिभिन डिभिजन प्रमुख
9857820318



राज कुमार सापकोटा
सूचना अधिकारी
9857877020

सूचना	समाचार	प्रेस विज्ञापित	अन्य
 रोल्पा जिल्लाको ०७९१/८० को जिल्ला दर्रेट प्रकाशित मिति : 2022-07-14			

Tweets by @Twitter

कृषिको आधार: सिंचाइमा सुधार

कार्यालयको प्रोफाइल

आ.व. ०७८/०७९



प्रदेश सरकार
लुम्बिनी प्रदेश
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालय

जलस्रोत तथा सिंचाइ विकास डिभिजन कार्यालय
लिवाङ, रोल्पा




MAP OF NEPAL
PRADESH DIVISION

INDIA CHINA

International Boundary
Pradesh Boundary
District Boundary

STN - Kathmandu
Bharatpur
Gandhinagar

रोल्पा जिल्ला सांठ्यालिका नगरपालिकाको वडा विभागमा र साविक गा. वि. नं. समेतको नक्सा

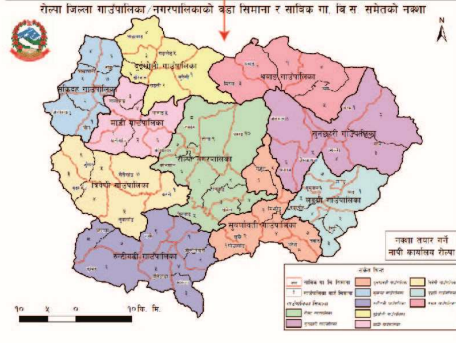

तकाला तयार गरी
साविक विभागमा रोल्पा

कार्यान्वयनमा ल्याइएका राम्रा अवधारणाहरु (Good Practices)



प्रमुख जिल्ला अधिकारी ज्यू को प्रमुख आथित्यमा ठेक्का म्याद भन्दा अगावै कार्य सम्पन्न गर्ने निर्माण व्यवसायिलाई सम्मान गरिदै ।

केही स्थलगत फोटोहरू

आयोजना कार्यान्वयन अवस्थाका फोटोहरु

23



चिउरीधारा सिंचाइ योजना रोल्पा १० रोल्पा

आयोजना कार्यान्वयन अवस्थाका फोटोहरु

24



चिउरीधारा सिंचाइ योजना रोल्पा १० रोल्पा

आयोजना कार्यान्वयन अवस्थाका फोटोहरु

25



मनगाड सिंचाइ योजना सुनिलस्मृति ५ रोल्पा

आयोजना कार्यान्वयन अवस्थाका फोटोहरु



सालघारी सिंचाइ योजना रोल्पा ४ रोल्पा

आयोजना कार्यान्वयन अवस्थाका फोटोहरु



पाखाखर्क रन्टबाङ्ग सिंचाइ योजना रोल्पा ४ रोल्पा

आयोजना कार्यान्वयन अवस्थाका फोटोहरु

28



गुरुङ्गाँउ लिफ्ट सिंचाइ योजना रोल्पा ४ रोल्पा

आयोजना कार्यान्वयन अवस्थाका फोटोहरु

29



सिबाङ्ग खोला तटबन्ध त्रिवेणी ५ रोल्पा

आयोजना कार्यान्वयन अवस्थाका फोटोहरु

30



स्याङखोला तटबन्ध सुनछहरी ३



वालकल्याण आधारभू विधालय पहिरो संरक्षण परिवर्तन १

आयोजना कार्यान्वयन अवस्थाका फोटोहरु

31



पाछावाङ् खोला तटबन्ध परिवर्तन ३ रोल्पा

आयोजना कार्यान्वयन अवस्थाका फोटोहरु

32



आयोजना कार्यान्वयनमा आएका समस्या समाधानको लागि ज. उ. स. सँग छलफल


आयोजना कार्यान्वयन अवस्थाका फोटोहरु

32



भौगोलिक कठिनाइको कारण निर्माण सामग्री ढुवानीमा कठिनाइ

आयोजना कार्यान्वयन अवस्थाका फोटोहरु

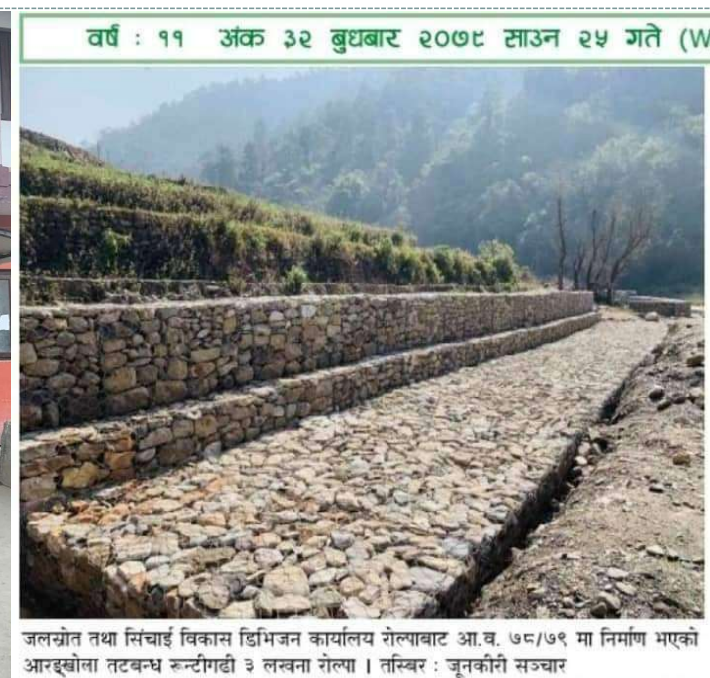

जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट कार्यालयलाई
सम्मान । मिति २०७९।०९।१३

आ व ०७८।७९ मा गरेको आरङ्गखोला
तटबन्धनको फोटो मिडियमा

आभारी छु

- माननिय मन्त्रिज्यू ,राज्यमन्त्रिज्यू ,सचिवज्यू, महाशाखा प्रमुखज्यूहरु र मन्त्रालयको सम्पूर्ण टिम
- कार्यालयका सम्पूर्ण कर्मचारी साथिहरु
- जिल्ला स्थित सम्पूर्ण सरोकार कार्यालय प्रमुखज्यूहरु

धन्यवाद !
