



मन्त्रालयस्तरीय विकास समस्या समाधान समितिको बैठक तथा
आ.व.०७८/७९ को

वार्षिक प्रगति समीक्षा-२०७९

1

मिति :- २०७९ श्रावण ४ र ५ गते
स्थान: होटल श्रीनगर प्रा.लि. पाल्पा

प्रस्तुतकर्ता:
नि.डि.प्र. श्री भेष राज भुसाल
जलस्रोत तथा सिंचाई विकास डिभिजन
कार्यालय
रोल्पा

कृषिको आधार : सिंचाइमा सुधार

प्रस्तुती सूची

2

- कार्यालयको जनशक्ति अवस्था
- कार्यालयको समग्र वित्तीय तथा भौतिक प्रगति अवस्था
- बजेटको श्रोतगत प्रगति अवस्था
- योजना कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या, प्रयास तथा उपायहरू
- बेरुजु तथा सम्परीक्षणको अवस्था
- केही राम्रा अभ्यास तथा सूचना प्रविधिको उपयोग
- केही स्थलगत फोटोहरू

कार्यालयको समष्टिगत जनशक्ति विवरण

क्र.सं.	सेवा	स्वीकृत दरबन्दी			पदपूर्ति	स्थायी रिक्त दरबन्दी	कैफियत
		स्थायी	अस्थायी	जम्मा			
१	प्राविधिक	७	-	७	३	४	
२	प्रशासनिक	४	१	५	४	१	कार्यालय सहयोगी समेत गरि
	कूल	१२	१	१२	७	५	

पदपूर्ति र रिक्त विवरण

क्र.सं.	पद	सेवा	समूह	उप-समूह	तह/श्रेणी	स्वीकृत			पदपूर्ति		रिक्त	कै.
						स्थायी	अस्थायी	जम्मा	स्थायी	करार/ज्या.		
१	सि.डि.ई.	इन्जि.	सिभिल	ईरिगेशन	अधिकृत नवौं/दशौं	१	-	१	-	-	१	
२	इन्जिनियर	इन्जि.	सिभिल	सिंचाइ	अधिकृत सातौं/आठौं	२	-	२	१	-	१	
३	सहायक/अधिकृत	प्रशासन	सा.प्र.		स.पाँचौं/अ.छैटौं	१	-	१	१	-	-	
४	सहायक/अधिकृत	प्रशासन	लेखा		स.पाँचौं/अ.छैटौं	१	-	१	-	-	१	
५	सब.ई./अधिकृत	इन्जि.	सिभिल	सिंचाइ	स.पाँचौं/अ.छैटौं	३	-	३	२	-	१	
६	ए.ओ.				स.पाँचौं/अ.छैटौं	१	-	१	-	-	१	
७	ह.स.चा.					-	१	१	-	१	-	
८	का.स.					२	-	२	१	१	-	
	जम्मा					१२	-	१२	५	२	५	

आ.व.०७८/७९ को वार्षिक प्रगति सारांश

रु.हजारमा

क्र.सं	बजेट शिर्षक	वार्षिक विनियोजन	कूल खर्च	खर्च (%)	कैफियत
१	चालु	८०९८.००	६४३२.०६४	७९.४२	
२	पूँजीगत	१७२२००.००	१६४४३८.७९४	९५.४९	
	कूल जम्मा	१८०२९८.००	१७०८७०.८५८	९०.७५	

आयोजना कार्यान्वयनको अवस्था (सिंचाइ)

सि.नं.	कार्यक्रमको नाम	आयोजनाहरूको कार्यान्वयन अवस्था (संख्या)					कैफियत
		कूल	खरिद प्रक्रियामा	कार्यान्वयन भैरहेका	यस आ.व.को हालसम्म सम्पन्न भएका	कार्यान्वयन हुन नसकेका	
क	समानिकरण						
१	मझौला तथा वैकल्पिक प्रविधिमा आधारित सिंचाइ आयोजना	२४	०	८	१४	२	
२	सिंचाई आयोजना मर्मत सुधार तथा विस्तार	५२	-	-	५१	१	
३	जल उत्पन्न प्रकोप न्यूनिकरण तथा व्यवस्थापन	४४	-	१	४३	०	
	समानिकरण जम्मा	१२०	०	९	१०८	३	
ख	सशर्त						
१	संघ शसर्त अनुदान तर्फका कार्यक्रमहरू	१	-	-	१	०	
	सशर्त जम्मा						
	कूल जम्मा (क)+(ख)	१२१	०	९	१०९	३	

कार्यान्वयनमा रहेका योजनाहरुको समष्टिगत भौतिक प्रगति

क्र.सं.	कार्यक्रमको नाम	कूल आयोजनाहरुको संख्या	>८०% प्रगति भएको संख्या	५०-८०% प्रगति भएको संख्या	<५०% प्रगति भएको संख्या	कार्यान्वयन हुन नसकेका
क	समानिकरण					
१	मझौला तथा वैकल्पिक प्रविधिमा आधारित सिंचाइ आयोजना	२४	१८		४	२
२	सिंचाई आयोजना मर्मत सुधार तथा विस्तार	५२	५१	-	-	१
३	जल उत्पन्न प्रकोप न्यूनिकरण तथा व्यवस्थापन	४४	४४	-	-	-
	समानिकरण जम्मा	१२०	११३		४	३
ख	शसर्त					
	संघ शसर्त अनुदान तर्फका कार्यक्रमहरु	१	१	-	-	०
	कूल जम्मा	१२१	११४		४	३

बजेटको श्रोत अनुसार प्रगति विवरण

रु.हजारमा

सि. नं.	बजेटको श्रोत	जम्मा आयोजना संख्या	वार्षिक विनियोजन	वार्षिक खर्च	वार्षिक प्रगति		कार्यान्वयनमा गएका आयोजना संख्या	सम्पन्न भएका आ. संख्या	कैफियत
					भौतिक (%)	वित्तीय (%)			
१	समानीकरण/ राजश्व अनुदान	१२०	१६७२००.००	१५९४४०.००	९८	९५.३५	११७	१०८	
२	सशर्त अनुदान	१	५०००.००	४९९८.७८६	१००	९९.९७	१	१	
	जम्मा	१२१	१७२२००.००	१६४४३८.७९४	९९	९५.४९	११८	१०९	

कार्यक्रमगत प्रगति विवरण (सिंचाइ)

रु.हजारमा

क्र. सं.	कार्यक्रमको नाम	वार्षिक बजेट	वार्षिक खर्च	वार्षिक प्रगति		कैफियत
				भौतिक(%)	वित्तीय(%)	
क	समानिकरण					
१	मझौला तथा बैकल्पिक प्रविधिमा आधारित सिं	७५३००.००	७१४००.३४६	९५	९४.८२	
२	सिंचाइ आयोजना मर्मत सुधार तथा विस्तार	३६४००.००	३४९५६.१६१	१००	९६.०३	
३	जल उत्पन्न प्रकोप न्यूनिकरण तथा व्यवस्थापन	५५५००.००	५३०८३.५०१	९९	९५.६४	
	समानिकरण जम्मा	१६७२००.००	१५९४४०.००	९८	९५.३५	
ख	सशर्त					
	संघ शसर्त अनुदान तर्फका कार्यक्रमहरु	५०००.००	१४९९८.७८६	१००	९९.९७	
	सशर्त जम्मा	५०००.००	१४९९८.७८६	१००	९९.९७	
	कूल जम्मा (क)+(ख)	१७२२००.००	१६४४३८.७९४	९९	९५.४९	

मुख्य-मुख्य आयोजनाहरुको प्रगति विवरण

रु.हजारमा

क्र. सं.	कार्यक्रमको नाम	वार्षिक बजेट	वार्षिक खर्च	वार्षिक प्रगति		कैफियत
				भौतिक(%)	वित्तीय(%)	
क	कार्यक्रमको नाम					
१	कलमखोला सिं यो सुनिलस्मृति १	६०००	५९५३	१००	९९.२१	योजना सम्पन्न
२	लहरीखोला सिं यो माडी ३	६०००	५९९३	१००	९९.८९	ठेक्का सम्पन्न
३	घान्टुखोला सिं यो रोल्पा २	८५००	८४८७	१००	९९.८५	ठेक्का सम्पन्न
४	चिउरीधारा सिं यो रोल्पा १०	२१४००	२००८२	९५	९३.८४	क्रमागत
५	दबसे लिफ्ट सिं यो लुङ्ग्री २	२१००	१६२४	९०	७७.३४	क्रमागत
६	धम्पाखोला हरिगाँउ महेन्द्री सिं यो सुनिलस्मृति २	२०००	२०००	१००	१००	क्रमागत
७	गुनामखोला कालिजङ् धनचौर सिं यो रुन्टीगढी १	१५००	११७४	८५	७८.२६	क्रमागत
८	मनगाड सिं यो सुनिलस्मृति ५	२०००	१९२३	१००	९६.१५	क्रमागत
९	झागरखोला सिं यो त्रिवेणी ५	८५००	८४८५	१००	९९.८२	ठेक्का सम्पन्न

बेरुजु सम्बन्धी विवरण (प्रदेश कार्यालय स्थापना हुनु पूर्वको) रु.हजारमा

11

क्र सं	बेरुजु किसिम	जम्मा बेरुजु रकम (आ.ब.२०७४/७५ सम्म)	हाल सम्म फछ्यौट रकम	फछ्यौट %	कैफियत
१	असुल उपर गर्नु पर्ने	५१६.११४	२१.४६९	४.१५%	
२	नियमित गर्नु पर्ने	८८९९.८८	-		
३	पेशकी	-	-		
	कूल जम्मा	९४१५.९९४	२१.४६९		

बेरुजु सम्बन्धी विवरण (प्रदेश कार्यालय स्थापना पछिको)

रु.हजारमा

12

क्र सं	बेरुजु किसिम	जम्मा बेरुजु रकम (आ.ब.२०७७/७८सम्म)	हाल सम्म फछ्यौट रकम	फछ्यौट %	कैफियत
१	असुल उपर गर्नु पर्ने	७८.६३१	५१.६२४	६५.६५ %	आ.ब.२०७७/७८ को नन्फाईलर रु ३५९.७५८ नियमित गर्नु पर्ने बेरुजु
२	नियमित गर्नु पर्ने	३५९.७५८	३५९.७५८	१००%	
३	पेशकी	४९३६.००	४९३६.००	१०० %	
	कूल जम्मा	५०१४.६३१	४९८७.६२४	९९.४६%	

कार्यान्वयनमा ल्याइएका राम्रा अवधारणाहरु (Good Practices)



प्रदेश सरकार
लुम्बिनी प्रदेश
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालय
जलस्रोत तथा सिंचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, रोल्पा
रोल्पा, नेपाल



जलस्रोत तथा सिंचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, रोल्पा
आज मिति: २०७१, श्रावण ०३ गते सोम ०७:५६:५३

हाम्रो बारेमा ▾ सूचना पाटी ▾ प्रगति विवरण ऐन तथा नियम ▾ डाउनलोड ▾ मिडिया सेन्टर ▾ सम्पर्क

ताजा जानकारी: रोल्पा जिल्लाको ०७९१/८० को जिल्ला दर्रेट समान तथा मझौला सिंचाइ योजना माग गर्दा कुषकले भर्नु पर्ने फारम नगरिक वडापत्र जलस्रोत तथा सिंचाइ विकास डिभिजन कार्यालय



परिचय

बि.सं. २०७५ साल देखि सिंचाइ विभाग अन्तर्गत जिल्ला सिंचाइ कार्यालय रोल्पाको स्थापना भएको हो । स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०७२ जारी भइ लागु भए पछि वि.सं. २०५८ मा सिंचाइ विभागको संरचनात्मक फेरबदल भए पश्चात् २०७२ सम्म रोल्पा जिल्लामा सिंचाइ सम्बन्धि योजनाहरु मध्यपश्चिमाञ्चल सिंचाइ विकास डिभिजन कार्यालय नं ४ प्युठान र जलउत्पन्न सम्बन्धि योजनाहरु जलउत्पन्न प्रकोप नियन्त्रण सस डिभिजन कार्यालय नं. ३ दाङबाट हुँदै आएकोमा बि.सं. २०७२ साल भाद्र देखी मध्य पश्चिमाञ्चल क्षेत्रिय सिंचाइ निर्देशनालय अन्तर्गत सिंचाइ विकास डिभिजन कार्यालय रोल्पाको स्थापना भई सिंचाइ सम्बन्धि कार्यहरु हुँदै आएका थिए । जलउत्पन्न प्रकोप व्यवस्थापन सम्बन्धि कार्यहरु जल उत्पन्नप्रकोप व्यवस्थापन डिभिजन प्युठानबाट हुँदै आएका थिए ।

नेपालको संविधान, २०७२ ले परिश्रित गरे अनुसार जलस्रोत, सिंचाइ तथा जल उत्पन्न प्रकोप व्यवस्थापन सम्बन्धि केन्द्रिय स्तरमा ठुला आयोजना तथा परियोजनाहरु, अन्तर प्रदेशिय बहुउपयोगि आयोजनाहरु, अन्तरदेशिय सरोकार रहने बहुउद्देश्यीय आयोजनाहरुको तर्जुमा, नीति निर्माण, कार्यान्वयन तथा अनुगमनमा संघबाट गर्नुपर्ने कार्यहरुको लागि साविकका सिंचाइ विभाग र जलउत्पन्न प्रकोप व्यवस्थापन विभाग खारिज भई बि.सं. [डा. रणधुमि](#)



श्री बिष्वराज भुषाल
प्रिभिन डिभिजन प्रमुख
9857820318



राज कुमार सापकोटा
सूचना अधिकारी
9857877020

सूचना	समाचार	प्रेस विज्ञापित	अन्य
 रोल्पा जिल्लाको ०७९१/८० को जिल्ला दर्रेट प्रकाशित मिति : 2022-07-14			

Tweets by @Twitter

कृषिको आधार: सिंचाइमा सुधार

कार्यालयको प्रोफाइल

आ.व. ०७८/०७९






MAP OF NEPAL
PRADESH DIVISION

INDIA CHINA

International Boundary
Pradesh Boundary
District Boundary

STN - Kathmandu
Bharatpur
Gandhinagar

रोल्पा जिल्ला सांठ्यालिका नगरपालिकाको वडा विभागमा र साविक गा. वि. नं. समेतको नक्सा

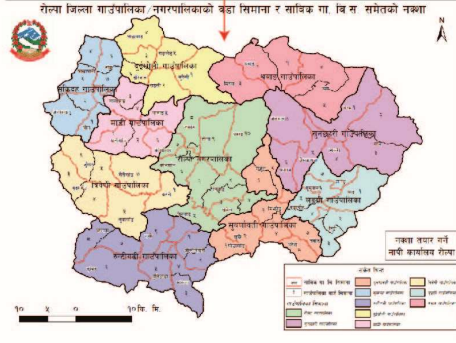

तकाला नगर गा. वि. नं. साविकको नक्सा

वडा नं. १
वडा नं. २
वडा नं. ३
वडा नं. ४
वडा नं. ५
वडा नं. ६
वडा नं. ७
वडा नं. ८
वडा नं. ९
वडा नं. १०
वडा नं. ११
वडा नं. १२
वडा नं. १३
वडा नं. १४
वडा नं. १५
वडा नं. १६
वडा नं. १७
वडा नं. १८
वडा नं. १९
वडा नं. २०
वडा नं. २१
वडा नं. २२
वडा नं. २३
वडा नं. २४
वडा नं. २५
वडा नं. २६
वडा नं. २७
वडा नं. २८
वडा नं. २९
वडा नं. ३०
वडा नं. ३१
वडा नं. ३२
वडा नं. ३३
वडा नं. ३४
वडा नं. ३५
वडा नं. ३६
वडा नं. ३७
वडा नं. ३८
वडा नं. ३९
वडा नं. ४०
वडा नं. ४१
वडा नं. ४२
वडा नं. ४३
वडा नं. ४४
वडा नं. ४५
वडा नं. ४६
वडा नं. ४७
वडा नं. ४८
वडा नं. ४९
वडा नं. ५०
वडा नं. ५१
वडा नं. ५२
वडा नं. ५३
वडा नं. ५४
वडा नं. ५५
वडा नं. ५६
वडा नं. ५७
वडा नं. ५८
वडा नं. ५९
वडा नं. ६०
वडा नं. ६१
वडा नं. ६२
वडा नं. ६३
वडा नं. ६४
वडा नं. ६५
वडा नं. ६६
वडा नं. ६७
वडा नं. ६८
वडा नं. ६९
वडा नं. ७०
वडा नं. ७१
वडा नं. ७२
वडा नं. ७३
वडा नं. ७४
वडा नं. ७५
वडा नं. ७६
वडा नं. ७७
वडा नं. ७८
वडा नं. ७९
वडा नं. ८०
वडा नं. ८१
वडा नं. ८२
वडा नं. ८३
वडा नं. ८४
वडा नं. ८५
वडा नं. ८६
वडा नं. ८७
वडा नं. ८८
वडा नं. ८९
वडा नं. ९०
वडा नं. ९१
वडा नं. ९२
वडा नं. ९३
वडा नं. ९४
वडा नं. ९५
वडा नं. ९६
वडा नं. ९७
वडा नं. ९८
वडा नं. ९९
वडा नं. १००

प्रदेश सरकार
लुम्बिनी प्रदेश
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालय
जलस्रोत तथा सिंचाइ विकास डिभिजन कार्यालय
लिवाङ, रोल्पा

कार्यान्वयनमा ल्याइएका राम्रा अवधारणाहरु (Good Practices)




प्रमुख जिल्ला अधिकारी ज्यू को प्रमुख आतिथ्यमा ठेक्का म्याद भन्दा अगावै कार्य सम्पन्न गर्ने निर्माण व्यवसायिलाई सम्मान गरिदै ।

केही स्थलगत फोटोहरू

आयोजना कार्यान्वयन अवस्थाका फोटोहरु

16

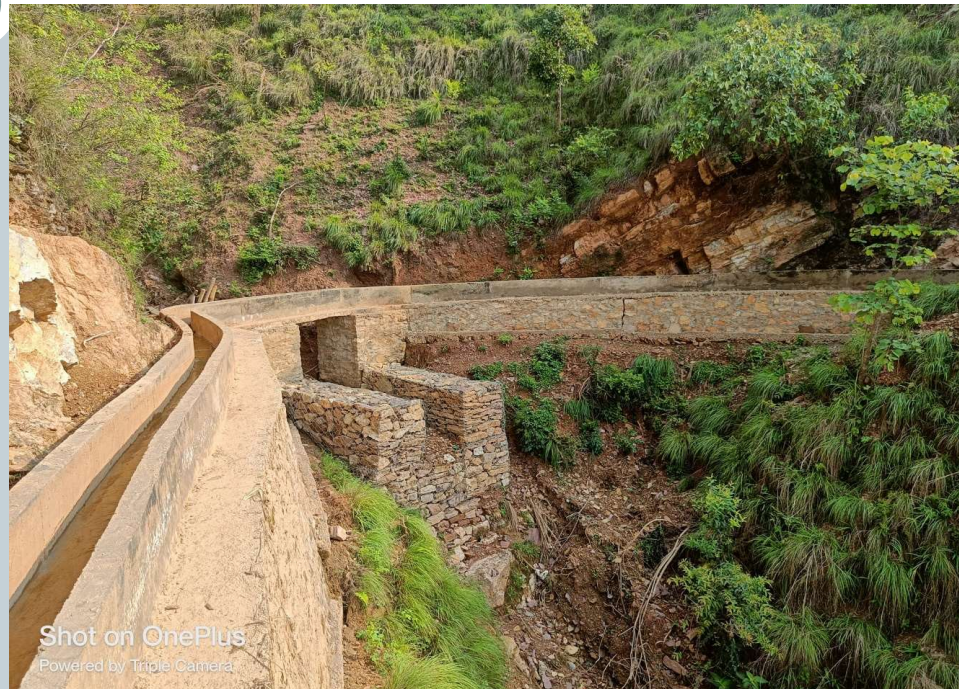

झागरखोला सिंचाइ योजना त्रिवेणी ५ रोल्पा

आयोजना कार्यान्वयन अवस्थाका फोटोहरु

17



कलमखोला सिंचाइ योजना सुनिलस्मृति १ रोल्पा
इन्टेक



कलमखोला सिंचाइ योजना सुनिलस्मृति १ रोल्पा
डिसेलिटिङ बेसिन

आयोजना कार्यान्वयन अवस्थाका फोटोहरु

18



लहरीखोला सिंचाइ योजना माडी ३ रोल्पा

आयोजना कार्यान्वयन अवस्थाका फोटोहरु

19



घान्टुखोला सिंचाइ योजना रोल्पा २ रोल्पा

आयोजना कार्यान्वयन अवस्थाका फोटोहरु

20



धारापानी मुलावारी सिंचाइ योजना रोल्पा १ रोल्पा

आयोजना कार्यान्वयन अवस्थाका फोटोहरु

21



चिउरीधारा सिंचाइ योजना रोल्पा १० रोल्पा

आयोजना कार्यान्वयन अवस्थाका फोटोहरु


22



ओखेनी सालघारी रुन्टाबाङ् सिंचाइ योजना रोल्पा ४ रोल्पा

आयोजना कार्यान्वयन अवस्थाका फोटोहरु

23

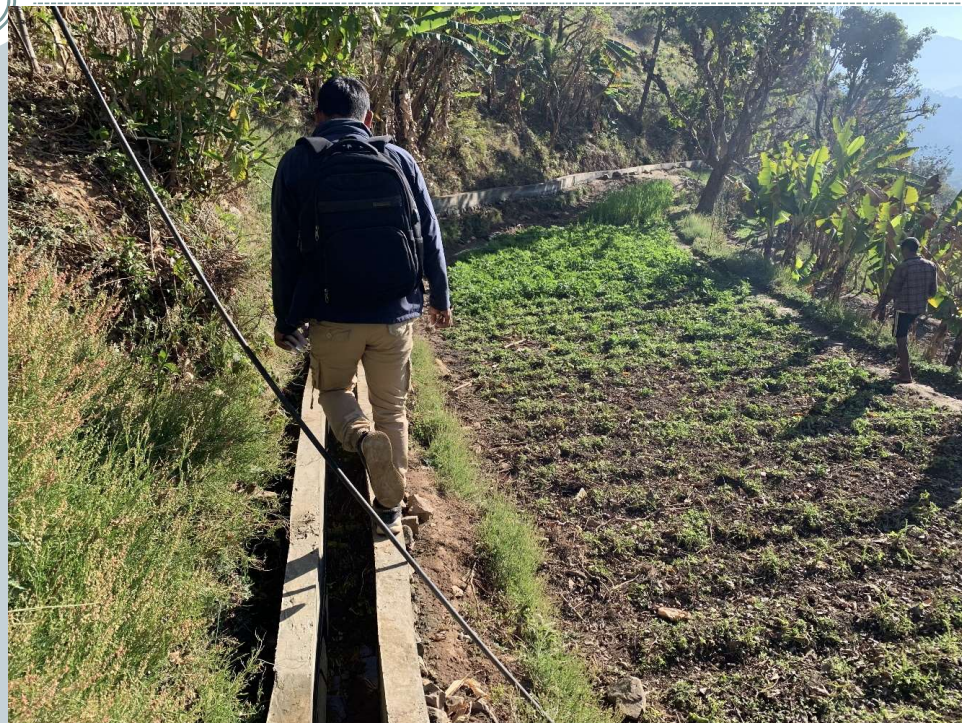

खरिखोला अमरगैरा अमिलधारा साउनेखेत सिंचाइ योजना सुनिलस्मृति ३ रोल्पा

आयोजना कार्यान्वयन अवस्थाका फोटोहरु

24



निर्माण पूर्व



निर्माण पछि

निरही सिंचाइ योजना लुङ्ग्री ३ रोल्पा

आयोजना कार्यान्वयन अवस्थाका फोटोहरु

25



निर्माण पूर्व



निर्माण पछि

गद्देखोला सिंचाइ योजना लुङ्ग्री २ रोल्पा

आयोजना कार्यान्वयन अवस्थाका फोटोहरु

26



तिनखेत सिंचाइ योजना रुन्टीगढी १ रोल्पा



रिठेखोला सिंचाइ योजना लुङ्ग्री ३ रोल्पा

आयोजना कार्यान्वयन अवस्थाका फोटोहरु

27



आराङ्ग खोला तटबन्ध रुन्टीगढी ३ रोल्पा

आयोजना कार्यान्वयन अवस्थाका फोटोहरु

28



बागमारा बसपार्क तथा बहुउद्देश्य कभर्ड हल संरक्षण
परिवर्तन ३ रोल्पा



आराङ्ग खोला तटबन्ध रुन्टीगढी ३ रोल्पा

आयोजना कार्यान्वयन अवस्थाका फोटोहरु

29



मिरुलखोला तटबन्ध थवाङ् ३ रोल्पा



पाछावाङ् खोला तटबन्ध परिवर्तन ३ रोल्पा

आयोजना कार्यान्वयन अवस्थाका फोटोहरु

30



उर्जा जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालय मुकाम बुटवल बाट
योजना अनुगमन ठूलोखुङ् सिंचाइ योजना रोल्पा



रातामाटाखोला पहिरो तटबन्ध लुङ्ग्री ४ चेकड्याम

आयोजना कार्यान्वयन अवस्थाका फोटोहरु

21



संस्थागत विकास तथा कृषि सम्बन्धि तालिम विभिन्न ज. उ. स. बाट को सहभागिता

आयोजना कार्यान्वयन अवस्थाका फोटोहरु

32



माननिय राज्यमन्त्रिज्यू बाट कलमखोला सिंचाइ योजनाको अनुगमन तथा निर्देशन गर्नु हुदै ।

आयोजना कार्यान्वयन अवस्थाका फोटोहरु

33



माननिय राज्यमन्त्रिज्यू बाट ठुलोखुड् सिंचाइ योजनाको अनुगमन तथा निर्देशन गर्नु हुदै ।

आयोजना कार्यान्वयन अवस्थाका फोटोहरु

34



माननिय मन्त्रिज्यू सचिबज्यू, बाट ठुलोखुङ सिंचाइ योजनाको अनुगमन तथा निर्देशन गर्नु हुदै ।

आयोजना कार्यान्वयन अवस्थाका फोटोहरु

35



माननिय मन्त्रिज्यू सचिवज्यू लगायत बाट चिउरीधारा सिंचाइ योजनाको अनुगमन तथा निर्देशन गर्नु हुदै ।

आयोजना कार्यान्वयन अवस्थाका फोटोहरु

36



माननिय राज्यमन्त्रिज्यू बाट कार्यालयको निरीक्षण पश्चात



माननिय मन्त्रिज्यू, सचिवज्यू, प्र.जि.अ., सुरक्षा निकायका प्रमुखहरु बाट कार्यालयको निरीक्षण पश्चात

आभारी छु

- माननिय मन्त्रिज्यू ,राज्यमन्त्रिज्यू ,सचिवज्यू, महाशाखा प्रमुखज्यूहरु र मन्त्रालयको सम्पूर्ण टिम
- कार्यालयका सम्पूर्ण कर्मचारी साथिहरु
- प्र. जि. अ. रोल्पा लगायत सम्पूर्ण सरोकार कार्यालय प्रमुखज्यूहरु

धन्यवाद !
