

कृषिको आधार: सिंचाइमा सुधार

कार्यालयको प्रोफाइल

आ.व. ०७८/०७९



प्रदेश सरकार

लुम्बिनी प्रदेश

उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालय


जलस्रोत तथा सिंचाइ विकास डिभिजन कार्यालय

लिवाङ, रोल्पा

कृषिको आधार: सिंचाइमा सुधार

कार्यालयको प्रोफाइल

आ.व. ०७८/०७९



प्रदेश सरकार

लुम्बिनी प्रदेश

उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालय

जलस्रोत तथा सिंचाई विकास डिभिजन कार्यालय

लिवाङ, रोल्पा

विषय सूची

१ पृष्ठभूमि	१
२ कार्यक्षेत्र	२
३ लक्ष्य	२
४ उद्देश्य	३
५ रणनीति	३
६ कार्यनीति	३
७ कार्यालयको सांगठनिक विवरण	४
८ कार्यालयको कर्मचारी पदपूर्तिको अवस्था	५
९ कार्यालयको कर्मचारी विवरण	५
१० यस कार्यालयबाट प्रदान गरिने सेवा शाखा लाग्ने दस्तुर अवधि र जिम्मेवार ब्यक्ति	६
नागरिक बडापत्र	७
११ आ. व. ०७८/७९ को वार्षिक प्रगति सारांश	१०
१२ आ. व. ०७८/७९ को कार्यक्रमगत वार्षिक प्रगति विवरण	१०
१३ आ. व. ०७८/७९ मा यस डिभिजन कार्यालय बाट सम्पादन गरेका कामको विवरण	११
१३.१ प्रदेश समानिकरण तर्फ	११
१३.१.१ मझौला तथा वैकल्पिक प्रविधिमा आधारित सिंचाइ योजना	११
१३.१.२ सिंचाइ आयोजना मर्मत सुधार तथा विस्तार कार्यक्रम	१३
१३.१.३ जलउत्पन्न प्रकोप न्यूनिकरण तथा व्यवस्थापन कार्यक्रम	१६
१३.२ मझौला सिंचाइ योजना (संघ सशर्त)	१९
१४ आ व ०७८/७९ मा यस डिभिजन कार्यालय बाट सम्पादन गरेका कामको संरचनागत विवरण	२०
१४.१ मझौला तथा वैकल्पिक प्रविधिमा आधारित सिंचाइ योजना	२०
१४.२ सिंचाइ आयोजना मर्मत सुधार तथा विस्तार कार्यक्रम	२२

१४.३ जलउत्पन्न प्रकोप न्यूनिकरण तथा व्यवस्थापन कार्यक्रम	२५
१४.३.१ मभौला सिंचाइ योजना (संघ सशर्त)	२७
१५ कार्यक्रमगत खुद परिमाणात्मक वार्षिक प्रगति विवरण आ व ०७८/७९	२८
१६ बेरुजु सम्बन्धि विवरण (प्रदेश कार्यालय स्थापना हुनु पूर्वको)	२९
१७ बेरुजु सम्बन्धि विवरण (प्रदेश कार्यालय स्थापना पछीको)	२९
१८ आ व ०७८/७९ मा यस डिभिजन कार्यालयबाट सिंचाइ तथा नदी नियन्त्रणका अन्तर्गत DPR भएका योजनाहरू	२९
१९ आ व ०७८/७९ मा ठेक्का म्याद भन्दा अगाडी काम सम्पन्न गरी यस डिभिजन कार्यालय बाट सम्मानित हुने निर्माण व्यवसायिको नामावली	३०
२० आ.व. ०७७/७८ मा यस डिभिजन कार्यालयबाट सम्पादन गरेको कामको विवरण	३०
२०.१ प्रदेश समानिकरण अन्तर्गत	३०
२०.१.१ मभौला तथा वैकल्पिक प्रविधिमा आधारित सिंचाइ योजना	३०
२०.१.२ सिंचाइ आयोजना मर्मत सुधार तथा बिस्तार कार्यक्रम मर्मत	३१
२०.१.३ आकास्मिक प्राकृतिक प्रकोप नियन्त्रण कार्यक्रम	३२
२०.२ संघ सशर्त अन्तर्गत	३३
२०.२.१ मभौला सिंचाइ योजना	३३
२१ कार्यक्रमगत खुद परिमाणात्मक वार्षिक प्रगति विवरण आ व ०७७/७८	३४
२२ पहाडी साना किसानका लागि अनुकूलन आयोजना, जिल्ला आयोजना समन्वय ईकाई रोल्पा बाट आ व ०७८/७९ मा सम्पादन गरिएका सिंचाइ योजना सम्बन्धि विवरण	३५
२३ नेपाल ग्रामिण पुननिर्माण संस्था (RRN) रोल्पा बाट आ व ०७८/७९ मा सम्पादन गरिएका सिंचाइ योजना सम्बन्धि विवरण	३६
२४ माडी लुङ्ग्री कोरिडोर सिंचाइ आयोजना रोल्पा बाट आ व ०७८/७९ मा सम्पादन गरिएका सिंचाइ योजना सम्बन्धि विवरण	३७
२५ समस्याहरू	३८
२६ समस्या समाधानका उपायहरू	३८
२७ यस कार्यालय स्थापना भएदेखी हाल सम्म कार्यरत डिभिजन प्रमुखहरूको नामावली विवरण	३८
२८ यस कार्यालयको डिभिजन प्रमुख र सुचना अधिकारीको नाम र पद	३९
केही तस्विरहरू	४०-४४

१ पृष्ठभूमि

देशमा सिंचाइ सुविधा विकास र विस्तारको क्षेत्रमा परापूर्व काल देखि कृषकहरु आफैले र खास गरी योजनाबद्ध विकासको थालनी उप्रान्त नेपाल सरकारले लगानी गर्दै आईरहेको छ । सरकारी स्तरबाट वि. सं. १९७९ देखि चन्द्र नहरको निर्माण शुरु भए पश्चात मात्र सिंचाइको विकास शुरु हुन गएको देखिन्छ । तत्पश्चात वि.सं. १९८५ मा निर्मित चन्द्रनहरबाट पानी वितरण शुरु भई देशमा आधुनिक सिंचाइ प्रविधिको प्रादुर्भाव हुन गयो । वि.सं. २००० सालतिर सर्लाहीमा जुद्ध नहरको निर्माण गरियो भने कपिलवस्तुमा जगदीशपुर बाँध र पोखरामा पार्दी बाँधको थालनी गरियो । वि.सं. २००७ साल भन्दा अगाडिसम्म सिंचाइ क्षेत्रमा सरकारी संलग्नता सिमित थियो । सिंचाइ विकासका कार्यहरु बडाहाकिम मार्फत कार्यान्वयन हुने गर्दथे भने स्वदेशी प्राविधिक जनशक्तिको अभावमा विदेशी जनशक्ति समेत प्रयोग गर्नु पर्ने अवस्था थियो । वि.सं. २००७ सालको प्रजातान्त्रिक परिवर्तन पश्चात् स्वदेशी प्राविधिक जनशक्तिको उत्पादन शुरु भएतापनि वि. सं. २००९ सालमा स्थापना भएको नहर विभागको नेतृत्वको जिम्मेवारी वि. सं. २०१३ साल देखि मात्र नेपाली प्राविधिकबाट भयो । २०१३ सालमा प्रथम पञ्चवर्षीय योजना लागु भएपछि योजनाबद्ध रूपले सरकारी स्तरबाट सिंचाइ विकासको थालनी भएको हो । कतिपय आयोजनाहरुमा विकास समिति गठन भई कार्यान्वयन गर्न थालियो भने कतिपय केन्द्रीय स्तरमा नै आयोजना कार्यान्वयन गरिए । निर्माण सम्पन्न आयोजनाहरुमा आवश्यकता अनुरूप डिभिजन / सब डिभिजन स्थापना गरी संचालन र मर्मत संभार गर्न थालियो । २०२८ सालमा क्षेत्रगत हिसाबले ४ वटा क्षेत्रीय निर्देशनालय स्थापना गरियो भने २०३७ सालमा क्षेत्रीय निर्देशनालयको संख्या ४ वटा बाट ५ वटा पुऱ्याइयो । सिंचाइ संस्थागत विकासका क्रममा नहर विभाग, सिंचाइ तथा खानेपानी विभाग, सिंचाइ तथा जलवायु विज्ञान विभाग हुँदै २०४४ सालमा सिंचाइ विभागको नामाकरण गरि समग्र सिंचाइ विकास तथा नदी नियन्त्रणको प्रतिनिधि संस्थाको रूपमा स्थापित हुन पुग्यो । वि.सं. २०४५ साल देखि सिंचाइ विभाग अन्तर्गत ५ क्षेत्रीय निर्देशनालय, ७५ जिल्ला सिंचाइ कार्यालय, र केन्द्रिय आयोजनाहरु संचालनमा आए । तत् पश्चात स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५६ जारी भइ लागु भए पछि वि.सं. २०५८ मा सिंचाइ विभागको संरचनात्मक फेरबदल भयो । सोहि क्रममा विभाग अन्तर्गत रहेको जल उत्पन्न प्रकोप नियन्त्रण प्रविधि केन्द्र (Disaster Prevention Technical Centre) को रूपमा स्थापना भै जल उत्पन्न प्रकोप नियन्त्रणको क्षेत्रमा विभिन्न कार्यक्रमहरु शुरु गरेकोमा यसै केन्द्रलाई त्यसको उद्देश्य तथा उपलब्धिहरुलाई संस्थागत गर्न स्थायी संरचना तयार गर्ने क्रममा २०५६ माघ २४ गते जल उत्पन्न प्रकोप नियन्त्रण विभागको स्थापना गरियो । वि.सं. २०५८ मा सिंचाइ विभाग अन्तर्गत ५ क्षेत्रीय निर्देशनालय, २६ सिंचाइ विकास डिभिजन, २० सिंचाइ विकास सब डिभिजन, ८ सिंचाइ व्यवस्थापन डिभिजन, ३ यान्त्रिक डिभिजन तथा केन्द्रिय आयोजनाहरु संचालनमा आए । सोहि वर्ष जल उत्पन्न प्रकोप नियन्त्रण विभाग अन्तर्गत ७ डिभिजन र ५ सब डिभिजनको स्थापना भयो । वि.सं. २०७२

सालमा सबै जिल्लाहरूमा सेवा सञ्चालन सहज बनाउने हेतुले सिंचाइ विभाग तर्फ सिंचाइ डिभिजन/सब डिभिजनहरूको संख्या ७३ र सिंचाइ व्यवस्थापन डिभिजनको संख्या १३ पुर्याइयो । त्यस्तै जलउत्पन्न प्रकोप नियन्त्रण विभाग अन्तर्गत २४ डिभिजन, २ सब डिभिजन कार्यलयहरू संचालनमा आए । वि.सं. २०७३ सालमा जलउत्पन्न प्रकोप नियन्त्रण विभागको नाम परिवर्तन गरी जलउत्पन्न प्रकोप व्यवस्थापन विभाग राखियो ।

वि.सं. २०४५ साल देखि सिंचाइ विभाग अन्तर्गत जिल्ला सिंचाइ कार्यालय रोल्पाको स्थापना भएको हो । स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५६ जारी भइ लागु भए पछि वि.सं. २०५८ मा सिंचाइ विभागको संरचनात्मक फेरबदल भए पश्चात् २०७२ सम्म रोल्पा जिल्लामा सिंचाइ सम्बन्धि योजनाहरू मध्यपश्चिमाञ्चल सिंचाइ विकास डिभिजन कार्यालय नं ४ प्यूठान र जलउत्पन्न सम्बन्धि योजनाहरू जलउत्पन्न प्रकोप नियन्त्रण सब डिभिजन कार्यालय नं. ३ दाङ्ग बाट हुदै आएकोमा वि.सं. २०७२ साल भाद्र देखी मध्य पश्चिमाञ्चल क्षेत्रिय सिंचाइ निर्देशनालय अन्तर्गत सिंचाइ विकास डिभिजन कार्यालय रोल्पाको स्थापना भई सिंचाइ सम्बन्धि कार्यहरू हुदै आएका थिए । जलउत्पन्न प्रकोप व्यवस्थापन सम्बन्धि कार्यहरू जल उत्पन्नप्रकोप व्यवस्थापन कार्यालय नं १९ प्यूठान बाट हुदै आएका थिए ।

नेपालको संविधान, २०७२ ले परिलक्षित गरे अनुसार जलस्रोत, सिंचाइ तथा जल उत्पन्न प्रकोप व्यवस्थापन सम्बन्धि केन्द्रिय स्तरका ठुला आयोजना तथा परियोजनाहरू, अन्तर प्रदेशिय बहुउपयोगि आयोजनाहरू, अन्तरदेशिय सरोकार रहने बहुउद्देश्यीय आयोजनाहरूको तर्जुमा, नीति निर्माण, कार्यान्वयन तथा अनुगमनमा संघबाट गर्नुपर्ने कार्यहरूको लागि साविकका सिंचाइ विभाग र जलउत्पन्न प्रकोप व्यवस्थापन विभाग खारिज भई वि.सं. २०७४ मा जलस्रोत तथा सिंचाइ विभागको स्थापना भयो भने प्रदेश स्तरका मझौला तथा साना सिंचाइ सम्बन्धि सम्पूर्ण कार्य सिंचाइ योजना मर्मत संभार साथै मझौला तथा साना जलउत्पन्न प्रकोप सम्बन्धि कार्य गर्न प्रदेश सरकार लुम्बिनी प्रदेश तत्कालीन भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय अन्तर्गत जलस्रोत तथा सिंचाइ विकास डिभिजन कार्यालय रोल्पाको स्थापना भएको हो । हाल यो कार्यालय प्रदेश सरकार लुम्बिनी प्रदेश उर्जा जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको छ ।

२. कार्यक्षेत्र

यस कार्यालयको कार्यक्षेत्र लुम्बिनी प्रदेश रोल्पा जिल्ला रहेको छ ।

३ लक्ष्य

जलस्रोत तथा सिंचाइ संरचनाहरूको उचित विकास, मर्मत संभार तथा व्यवस्थापन गरी कृषियोग्य भुमिमा वर्षे भरी दिगो एवं भरपर्दो सिंचाइ सुविधा उपलब्ध गराई कृषि उत्पादकत्व तथा उत्पादन वृद्धि गरी गरिवि निवारणमा टेवा पुर्याउने

४ उद्देश्य

जलस्रोत तथा सिंचाइ विकास डिभिजन कार्यालय रोल्पाको मुख्य उद्देश्य निम्न प्रकार छन्

- रोल्पा जिल्लामा उपलब्ध जलस्रोतको समुचित उपयोग गरी सिंचाइ क्षेत्रको दिगो विकास एवं विस्तार गर्दै कृषि उत्पादकत्वको अभिवृद्धि गर्ने ।
- रोल्पा जिल्लाको कृषि योग्य जमिनमा सिंचाइको विकास तथा विस्तार गरी वर्षेभरी भरपर्दो सिंचाइ सुविधा पुऱ्याउने ।
- सिंचाइ तथा जल उत्पन्न प्रकोप व्यवस्थापनका लागि निर्मित संरचनाहरूको समयमै उचित मर्मत संभार गरी दिगो र भरपर्दो बनाउने ।
- निर्माण संपन्न भइ संचालनमा रहेका मझौला सिंचाइ प्रणालीहरूको दक्षता (Efficiency) वृद्धि तथा उपभोक्ताहरूको क्षमता विकास गरी सिंचाइ सेवालाई दिगो, भरपर्दो र प्रभावकारी बनाउन सिंचाइ प्रणालीहरूको पुर्ण रुपमा व्यवस्थापन हस्तान्तरण गर्दै जाने ।
- नदी तथा जलाधार व्यवस्थापनका लागि उपयुक्त प्रविधिको विकास तथा प्रयोग आवश्यक संरचनागत तथा गैरसंरचनागत कार्य गरी जल उत्पन्न प्रकोपबाट हुने क्षति न्यूनीकरण गर्ने साथै जोखिम रहित जग्गा उकास गर्ने ।
- मझौला तथा साना प्रकृतिका पहिरोहरूको व्यवस्थापनका लागि आवश्यक अध्ययन, अनुसन्धान र संरचनागत तथा गैरसंरचना गत कार्य गरी जनधनको क्षति न्यूनीकरण गर्ने ।
- सिंचाइ तथा जलउत्पन्न प्रकोप व्यवस्थापनका पुर्वाधार सम्बन्धी सूचना व्यवस्थापन प्रणालीको विकास तथा सुदृढीकरण गर्ने ।

५ रणनीति


- सिंचाइ तथा जल उत्पन्न प्रकोप सम्बन्धि कार्यहरू नेपाल सरकारको सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ र सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ साथै लुम्बिनी प्रदेश सार्वजनिक खरिद सम्बन्धि प्रदेश नियमावली २०७६, सिंचाइ ऐन सिंचाइ नियमावली, नीति, निर्देशिका लुम्बिनी प्रदेश उर्जा जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालय बाट जारी परिपत्रहरूको प्रकृया अवलम्बन गरी सम्पादन गरिने छ ।
- प्रचलित ऐन कानून एवं ठेक्का शर्त भित्र रही जल उपभोक्ता संस्था को सहकार्यमा तोकिएको बमोजिम गुणस्तर युक्त कार्यहरू गर्ने गराउने कार्य यस डिभिजन कार्यालयको हुनेछ ।

६. कार्यनीति :

- स्थानीय जनताको माग, स्थानिय तहको सिफारिस र त्यसको आवश्यकताको पहिचान प्रदेश सरकारको निर्देशन तथा परिपत्रलाई आधार मानी योजना छनौट गरिने छ ।

- कार्यस्थलको सामाजिक वातावरणको अध्ययन एवं मुल्यांकन गरी स्थानीय गैर सरकारी संस्था उपभोक्ता समिति, सामुदायिक वन समिति, महिला समूहहरूको समेत पहिचान गरी यस कार्यक्रम सञ्चालनमा सहभागी गराउने प्रयास गरिने छ ।
- सिंचाइ संरचनाको निर्माण कार्यलाई दिर्घकालीन सोच अनुरूप योजनाबद्ध तवरले सञ्चालन गरिने छ । मझौला सिंचाइ योजना तथा नदी नियन्त्रणकार्यको अध्ययन गरी विस्तृत योजना प्रतिवेदन तयार पारिने छ । यस्तो प्रतिवेदन अख्तियार प्राप्त अधिकारीबाट स्वीकृति प्राप्त भएपछि कार्यक्रम सञ्चालनमा आउने छ ।
- स्वीकृत गुरुयोजना भित्र रहि सिंचाइ योजना तथा नदी नियन्त्रण कार्यको लागत अनुमान एवं डिजाइन, ड्रइङहरू तयार पारिनेछ । यस्ता प्रतिवेदनहरूको स्वीकृति दिने कार्य उर्जा जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालय लुम्बिनी प्रदेश मार्फत हुने छ । साथै कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने कार्यमा संलग्न विभिन्न कर्मचारीहरूको कार्यविवरण अनुसार हुनेछ भने प्रशासनिक अधिकार नेपाल सरकारको प्रचलित कानून बमोजिम हुने छ ।
- सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ तथा सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ ले व्यवस्था गरे अनुसार ठेक्काबाट गराउन उपयुक्त हुने कार्य ठेक्का व्यवस्थापनबाट र उपभोक्ता समितिबाट गर्न सकिने (उपयुक्त ठहरिएका) कार्यहरू उपभोक्ता समिति मार्फत गराईने छ ।

७ कार्यालयको संगठानिक विवरण :

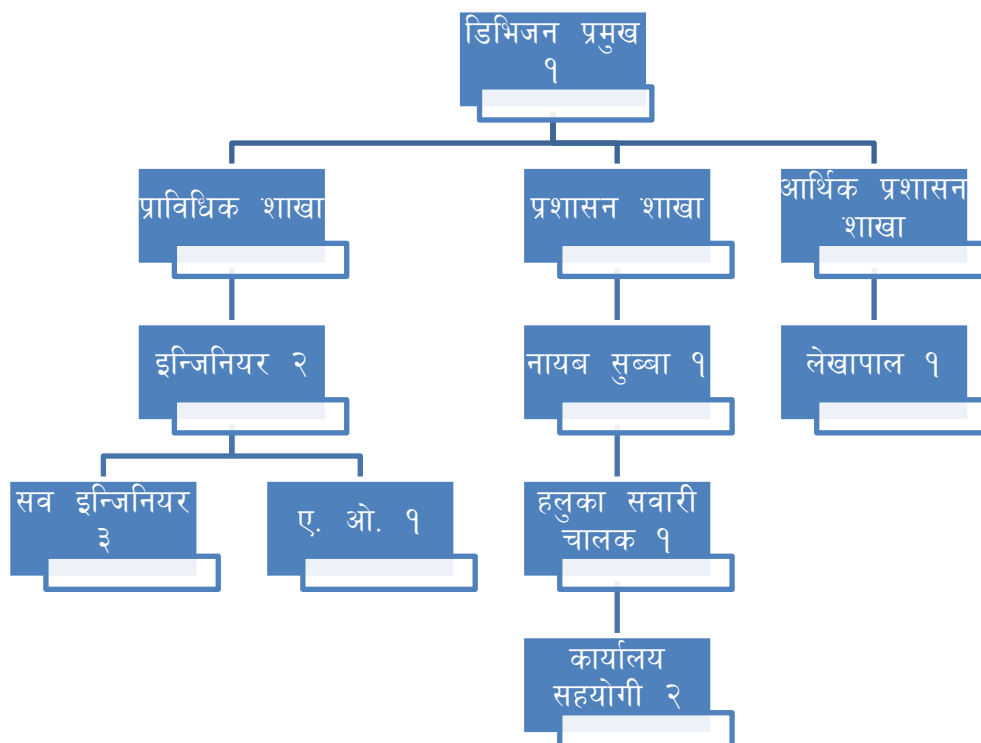

८ कार्यालयको कर्मचारी पदपुर्तिको अवस्था :

सि. नं.	पद	श्रेणी	सेवा	समुह	उपसमूह	स्वीकृत दरबन्दी	रिक्त दरबन्दी	कैफियत
१	कार्यालय प्रमुख (सि.डि.ई)	अधिकृत स्तर दशौं/नवौं	इन्जिनियरिङ्ग	सिभिल	इरिगेशन	१	१	
२	इन्जिनियर	अधिकृत स्तर सातौं/आठौं	इन्जिनियरिङ्ग	सिभिल	इरिगेशन	२	१	
३	सहायक/अधिकृत	सहायक पाचौं/अ.छैठौं	प्रशासन	सा.प्रशासन		१	१	
३	सहायक/अधिकृत	सहायक पाचौं/अ.छैठौं	प्रशासन	लेखा		१	१	
४	स.इन्जि./अधिकृत	सहायक पाचौं/अ.छैठौं	इन्जिनियरिङ्ग	सिभिल	इरिगेशन	३	१	
५	ए.ओ	सहायक चौथो/पाचौं	इन्जिनियरिङ्ग	सिभिल	इरिगेशन	१	१	
७	हलुका सवारी चालक	श्रेणीविहिन				१		करार
८	कार्यालय सहयोगी	श्रेणी विहिन				२		१ करार

९ कार्यालयको कर्मचारी विवरण

क्र.सं.	कर्मचारीको नाम,थर	तह वा श्रेणी	स्थायी ठेगाना	मोबाइल नं.	कैफियत
१	श्री भेषराज भुसाल	सातौं/रा.प.तृ.	सन्धिखर्क न.पा.१० अर्घाखाँची	९८५७८२०३१८	नि.डि.प्रमुख
२	श्री राजकुमार सापकोटा	अधिकृत छैठौं	बुटवल-११ रुपन्देही	९८५७८७७०२०	
३	श्री श्यामलाल रावत	पाँचौं/रा.प.अनं.प्र.	रोल्पा न.पा.०४ लिवाङ	९८५७८२२०६९	
४	श्री किशनजी कुंवर	पाँचौं/रा.प.अनं.	रोल्पा न.पा.०१ मेवाङ	९८६६७४४३२२	
५	श्री तिलकराम के.सी.	का.स.	रोल्पा न.पा.०२ थलिवाङ	९८६९९६५८७२	
६	श्री खुम बहादुर के.सी.	ह.स.चा.	रोल्पा न.पा.०५ जेदवाङ	९८६६८२६६५५	करार सेवा
७	श्री आम प्रकाश खड्का	का.स.	रोल्पा न.पा.०६ कोटगाँउ	९८४८९६३१०२	करार सेवा

१०. यस कार्यालयबाट प्रदान गरिने सेवा शाखा लाग्ने दस्तुर अवधि र जिम्मेवार ब्यक्ति

जलश्रोत तथा सिंचाई विकास डिभिजन कार्यालय, रोल्पा

नागरिक बडापत्र (CITIZEN CHARTER)

कार्यालयबाट प्रदान गरिने सेवाहरूको उद्देश्य :-

रोल्पा जिल्लाको कृषि योग्य जमिनमा सिंचाइको लागि पानी पुऱ्याई कृषि उत्पादनमा बृद्धि गर्ने सहयोग पुऱ्याउने ।

सेवाको प्रकार :-

क) नयाँ सिंचाइ योजनाहरूको निर्माण गर्ने एवं निर्माण सम्पन्न भएका सिंचाइ प्रणालीहरूको मर्मत संभार एवं व्यवस्थापन गरि सिंचाइको लागि पानी उपलब्ध गराउने ।

ख) कृषकहरूलाई सिंचाइ सम्बन्धी प्राविधिक परामर्श सेवा उपलब्ध गराउने ।

ग) जल उत्पन्न प्रकोप न्यूनिकरण गर्ने कार्य गर्ने ।

सि.नं.	उपलब्ध सेवा तथा सुविधाको विवरण	सेवा ग्राहीले पुऱ्याउनु पर्ने प्रक्रिया तथा प्रमाणहरु :-	सेवा वापत लाग्ने दस्तुर	सेवा दिन लाग्ने समय/वर्धि	जिम्मेवार शाखा	उजुरी गुनासो सुन्ने व्यक्तिको
१	साना,मझौला तथा ठूला सिंचाइ योजना निर्माण तथा नविकरण सुधार आदि	जिल्ला स्थित सिंचाइ कार्यालयबाट तोकिएको ढोँचाको अनुरोध फारम लिई त्यसमा सोधिएका सम्पूर्ण विवरणहरु भरि सिंचाइ योजनामा संचालन गर्न चाहने अधिकांश कृषकहरुले फारममा हस्ताक्षर गरि कार्यालयमा पेश गर्नु पर्नेछ ।	क) माग फारम साथ सिंचाइ गर्न प्रस्तावित क्षेत्रको प्रति रोपनी रु.२/५० को दरले हुने रकम धरौटीका रुपमा जम्मा गर्नु पर्नेछ । ख) योजना अध्ययन	नियमानुसार पहिचान भइसकेको योजनाहरु मध्येबाट प्राथमिकताको संभाव्य देखिएमा योजनाहरुको श्रोतको व्यवस्था गरी कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ ।	- योजना डिजाइन तथा कार्यान्वयन शाखा । - संस्थागत विकास तथा तालिम शाखा,	डिभिजन प्रमुख

			पश्चात संभाव्य भई संचालन हुने अवस्थामा कुल लागतको ०.५% रकम जम्मा गर्नु पर्नेछ । ग) नियम अनुसार जनसहभागिता गर्नु पर्नेछ ।		आर्थिक प्रशासन शाखा,	
२	किसान द्वारा सञ्चालित सिंचाइ प्रणालीहरूको मर्मत संभार कार्य	सिंचाइ प्रणालीहरूको कृषकको कावु भन्दा बाहिरको मर्मत संभार निर्माण कार्य गर्न सरकारी सहयोगको अपेक्षा राख्ने कृषकहरूले जल उपभोक्ता संस्था कृयाशिल भएको साधारणतया मर्मत संभारको लागि कम्तिमा ३ वर्ष देखि सरकारी सहयोग प्राप्त नगरेको तथा जिल्ला दैवि प्रकोप उद्धार समितिबाट समेत सिफारिस साथ आफ्नो जल उपभोक्ता संस्था मार्फत तोकिएको ढाँचामा क्षतिको विवरणहरू भरी आफूले मर्मत गर्न नसक्नाको कारण समेत प्रष्ट उल्लेख गरी कार्यालयमा निवेदन दिनु पर्नेछ ।	क) निशुल्क ख) नियमानुसार कम्तिमा १०% जनसहभागिता गर्नु पर्नेछ ।	अध्ययनबाट संभाव्य भएको र प्राथमिकतामा पर्ने सिंचाइ प्रणालीहरूको प्राविधिक प्रतिवेदन निर्देशनालयबाट स्वीकृत गराई संचालनमा ल्याइनेछ ।	- योजना डिजाइन तथा कार्यान्वयन शाखा, - संस्थागत विकास तथा तालिम शाखा, - आर्थिक प्रशासन शाखा,	डिभिजन प्रमुख
३	संस्था दर्ता तथा नविकरण	क) संस्था दर्ता सिंचाइ प्रणालीका उपभोक्ताहरूले उपलब्ध भएसम्म ३३ प्रतिशत महिला २ जना दलित, उत्पीडित र पिछ्छाएका जनजाति सहित ११ जना सम्मको कार्य समिति गठन गरी उपभोक्ता संस्थाको दर्ताका लागि १ प्रति माइज्युटिङ्ग २ प्रति पारित विधानमा अधिकांश मुल समितिको पदाधिकारीको हस्ताक्षर	रु.१००/००	१ महिना	- आर्थिक प्रशासन शाखा, - संस्थागत विकास तालिम शाखा,	डिभिजन प्रमुख

		भएको एवं सदस्यहरूको नागरिकताको फोटोकपी समेत राखी कार्यालयमा फारम लिई कार्यालयमा दर्खास्त दिनु पर्नेछ । ख)नविकरण नियमानुसार दर्ता भएका प्रत्येक उपभोक्ता संस्थाले आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले १० दिन भित्र महालेखा परिक्षकको विभागबाट मान्यता प्राप्त लेखा परिक्षकबाट लेखा परिक्षण गराई सोको प्रतिवेदन र वार्षिक प्रतिवेदन संलग्न गरि कार्यालयमा नविकरणको लागि दर्खास्त दिनु पर्नेछ ।		क) निशुल्क ख)नियमानुसार कर्मिमा ३ जनसहभागिता गर्नु पर्नेछ ।		अध्ययनबाट संभाव्य भएको र प्राथमिकतामा पर्ने सिंचाइ प्रणालीहरूको प्राविधिक प्रतिवेदन प्रदेश मन्त्रालयबाट स्वीकृति गराई सञ्चालनमा ल्याइनेछ ।	- योजना डिजाइन तथा कार्यान्वयन शाखा - संस्थागत विकास तथा तालिम शाखा - आर्थिक प्रशासन शाखा,	डिभिजन प्रमुख	
४	नयाँ प्रविधिमा आधारित सिंचाइ आयोजना					स्थानिय जनप्रतिनिधिको रोहवरमा योजनाका लाभप्राप्तीहरूको भेला बसी माइन्चुट गरी बाड को सिफारिस सहित कार्यालयमा निवेदन दिने			डिभिजन प्रमुख
५	पहिरो व्यवस्थापन,नदी नियन्त्रण तथा आर्किस्मक जलउत्पन्न प्रकोप व्यवस्थापन								डिभिजन प्रमुख

११ आ. व. ०७८/७९ को वार्षिक प्रगति सारांश

रकम रु हजारमा

क्र. सं.	बजेट शिर्षक	वार्षिक विनियोजन	कुल खर्च	खर्च प्रतिशत	कैफियत
१	चालु	८०९८	६४३२.०६४	७९.४२	
२	पूँजिगत	१७२२००	१६४४३८.७९४	९५.४९	
	जम्मा	१८०२९८	१७०८७०.८५८	९०.७५	

१२ आ. व. ०७८/७९ को कार्यक्रमगत वार्षिक प्रगति विवरण

हजारमा

रकम रु

क्र. सं.	कार्यक्रमको नाम	वार्षिक बजेट	वार्षिक खर्च	वार्षिक प्रगति %		कैफियत
				भौतिक	वित्तीय	
क	समानिकरण					
१	मझौला तथा वैकल्पिक प्रविधिमा आधारित सिंचाइ कार्यक्रम	७५३००	७१४००.३४६	९५	९४.८२	
२	सिंचाई आयोजना मर्मत सुधार तथा विस्तार कार्यक्रम	३६४००	३४९५६.१६१	१००	९६.०३	
३	जल उत्पन्न प्रकोप न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन कार्यक्रम	५५५००	५३०८३.५०१	९९	९५.६४	
	समानिकरण जम्मा	१६७२००	१५९४४०.००८	९८	९५.३५	
ख	सशर्त					
१	मझौला सिंचाई आयोजना	५०००	४९९८.७८६	१००	९९.९७	
	सशर्त जम्मा	५०००	४९९८.७८६	१००	९९.९७	
	कुल जम्मा (क+ ख)	१७२२००	१६४४३८.७९४	९९	९५.४९	

१३ आ. व. ०७८/७९ मा यस डिभिजन कार्यालय बाट सम्पादन गरेका कामको विवरण

१३ .१ प्रदेश समानिकरण तर्फ

१३ .१.१ मझौला तथा वैकल्पिक प्रविधिमा आधारित सिंचाइ योजना

रकम रु हजारमा

सि. नं.	योजनाको नाम	ठेगाना	आ. व. ०७८/७९ मा विनियोजित भएको रकम	आ. व. ०७८/७९ सम्म खर्च भएको रकम	कैफियत
१	घान्टुखोला सिंचाइ योजना	रोल्पा -२, रोल्पा	८५००	८४८७.१३९	क्रमागत
२	कलमखोला सिंचाइ योजना	सुनिलस्मृति -१, रोल्पा	६०००	५९५३.७४८	एप्राइजल बमोजिम योजना सम्पन्न
३	लहरीखोला सिंचाइ योजना	माडी -३ रोल्पा	६०००	५९९९.२२२	क्रमागत
४	चिउरीधारा सिंचाइ योजना	रोल्पा - १०, रोल्पा	२१४००	२००८२.१७०	क्रमागत
५	दबसे लिफ्ट सिंचाइ योजना	लुङ्ग्री -२, रोल्पा	२१००	१६२४.३४५	क्रमागत
६	धम्पाखोला हरिगाँउ महेन्द्री सिंचाइ योजना	सुनिलस्मृति -२, रोल्पा	२०००	२०००	क्रमागत
७	झागरखोला सिंचाइ योजना	त्रिवेणी -५ रोल्पा	८५००	८४८५.००१	क्रमागत
८	गुनामखोला कालिजङ धनचौर सिंचाइ योजना	रुन्टीगढी -१ ,रोल्पा	१५००	११७४.८५९	क्रमागत
९	मनगाड सिंचाइ योजना	सुनिलस्मृती -५, रोल्पा	२०००	१९२३.४७१	क्रमागत
१०	दारखोला तिन्त्रिकोट रुङ्ता सिंचाइ योजना	रोल्पा -४, रोल्पा	४०००	३९३३.७७६	सालवसाली

११	धारापानी मुलावारी सिंचाइ योजना	रोल्पा -१, रोल्पा	४०००	३९७६.००२	सालवसाली
१२	तिनखेत सिंचाइ योजना	रुन्टीगढी -१, रोल्पा	५००	४९०.२९५	सालवसाली
१३	कुन्जरी सिंचाइ योजना लुङ्ग्री	लुङ्ग्री -४, रोल्पा	५००	४६८.४३७	सालवसाली
१४	हुम्रीखोला सिंचाइ योजना	रोल्पा -७ रोल्पा	८००	७६७.३७७	सालवसाली
१५	कालाखोला सारङगे कोलवाङ सिंचाइ योजना	त्रिवेणी - २, रोल्पा	८००	७९६.३०९	सालवसाली
१६	काट्ने घरवारीखेत सिंचाइ योजना	सुनिलस्मृति - ५, रोल्पा	७००	६६६.३८३	सालवसाली
१७	नेवारखेत सिंचाइ योजना	सुनिलस्मृति- ५, रोल्पा	५००	४७५.७८२	सालवसाली
१८	काट्नेखेत सिंचाइ योजना	सुनिलस्मृति -५, रोल्पा	१०००	९३९.११७	सालवसाली
१९	डिहिखेत सिंचाइ योजना	सुनिलस्मृति -६, रोल्पा	८००	७६४.४३२	सालवसाली
२०	धानकुना सिंचाइ योजना	रोल्पा - ५, रोल्पा	१०००	००.००	सालवसाली
२१	गोलकटेरी सिंचाइ योजना	त्रिवेणी - ३, रोल्पा	६००	५७६.३६५	सालवसाली
२२	अध्ययन बाट सम्भाव्य देखीएका योजनाको निर्माण	रोल्पा जिल्ला विभिन्न	१००	००.००	सालवसाली
२३	सिंचाइ संस्थागत विकास कार्यक्रम	रोल्पा	५००	२८५.७००	सालवसाली
२४	परामर्श सेवा सिंचाइ तथा नदी नियन्त्रण आयोजना	रोल्पा	१५००	१४९१.१४८	सालवसाली
जम्मा			७५३००	७१४००.३४६	

१३.१.२ सिंचाइ आयोजना मर्मत सुधार तथा विस्तार कार्यक्रम

रकम रु हजारमा

सि. नं.	योजनाको नाम	ठेगाना	आ. व. ०७८/७९ मा विनियोजित भएको रकम	आ. व. ०७८/७९ सम्म खर्च भएको रकम	कैफियत
१	झिङ्सल जलासय पोखरी	रोल्पा -६, रोल्पा	६२५	६०२.५२८	सालवसाली
२	नन्दीखोला अधेरीखोला सिंचाइ योजना	त्रिवेणी - ७, रोल्पा	६२५	६०१.५४९	सालवसाली
३	द्रवेखोला बुर्तिवाङ सिंचाइ योजना	त्रिवेणी - ७, रोल्पा	६२५	६००.९७३	सालवसाली
४	हुङ्ग्रीखोला माडीचौर सिंचाइ योजना	रोल्पा - ७, रोल्पा	८३५	८१०.५१९	सालवसाली
५	बगाले लाकुरी सिंचाइ योजना	त्रिवेणी -२, रोल्पा	६२५	६०१.२४६	सालवसाली
६	कुनापानी खुमेल सिंचाइ योजना	रोल्पा - ३, रोल्पा	७१४	६९९.२९४	सालवसाली
७	परेमा दर्कवाङ सिंचाइ योजना	रोल्पा ६, रोल्पा	७१४	७०७.००९	सालवसाली
८	पुवाखोला लुङ्सुसा लिसरीवाङ धुनबोट सिंचाइ योजना	परिवर्तन -२, रोल्पा	८३३	७९६.६०२	सालवसाली
९	धैरेनीखोला कुवैरगाँउ पोखरी सिंचाइ योजना	त्रिवेणी - ७, रोल्पा	८३३	८०९.५६३	सालवसाली
१०	कालाखोला दोभान सारङ्गे कोलबोट सिंचाइ योजना	त्रिवेणी -२, रोल्पा	८३३	८१०.३६९	सालवसाली
११	परेमाखोला माडीचौर सिंचाइ योजना	रोल्पा - ७, रोल्पा	६२५	६०१.९९३	सालवसाली
१२	महानेटा सिंचाइ योजना	गगादेव - ५, रोल्पा	८३३	८११.३७०	सालवसाली
१३	निरही सिंचाइ योजना	लुङ्ग्री - ३, रोल्पा	१०००	९५८.०३७	सालवसाली

१४	चिसाखोला भिग्रीपाटी सिंचाइ योजना	लुङ्ग्री - ३, रोल्पा	११२५	१०७६.३६६	सालवसाली
१५	कर्णवर्ना ऐपे सिंचाइ योजना	लुङ्ग्री - १, रोल्पा	२५००	२३९०.२७५	सालवसाली
१६	कर्जाखोला देखी गणेश हेवाङ्गसम्म सिंचाइ योजना	रोल्पा - १०, रोल्पा	५००	४९६.०२३	सालवसाली
१७	भनभनेखोलादेखी उद्वन पहिरासम्म सिंचाइ योजना	रोल्पा - १०, रोल्पा	५००	४९८.१५२	सालवसाली
१८	खन्च्याङ्ग धाङ्सीखोला सिंचाइ योजना	रोल्पा - १०, रोल्पा	७१४	७०२.०९४	सालवसाली
१९	कौछना सिंचाइ योजना	सुनिलस्मृति - ६, रोल्पा	६२५	६०१.०२७	सालवसाली
२०	खाराखोला दाइवाङ्ग सिंचाइ योजना	सुनिलस्मृति - ३, रोल्पा	६२५	५९५.८४०	सालवसाली
२१	बागमारा सिंचाइ योजना	परिवर्तन - ३, रोल्पा	७१६	६९५.८६५	सालवसाली
२२	ऐलेखोला सिंचाइ योजना	परिवर्तन - ४, रोल्पा	७१४	६५१.५६९	सालवसाली
२३	माडी ओवाङ्ग सिंचाइ योजना	परिवर्तन - ६, रोल्पा	७१४	६३०.४१०	सालवसाली
२४	झालपोखरी निर्माण	परिवर्तन - २, रोल्पा	७१४	६९९.२९९	सालवसाली
२५	चिसापानी सामरी नारायणपूर गोठेडाँडा दिसनधारा सिंचाइ योजना	रुन्टीगढी - १, रोल्पा	८३३	८०९.३३८	सालवसाली
२६	रिठेखोला लामाचौर सिंचाइ योजना	लुङ्ग्री - ३, रोल्पा	५००	४९९.२४२	सालवसाली
२७	विदुङ्गचौका सिंचाइ योजना	लुङ्ग्री - ३, रोल्पा	८००	७९९.६६३	सालवसाली
२८	गद्देखोला सिंचाइ योजना	लुङ्ग्री - ५, रोल्पा	१५००	१४९९.९६२	सालवसाली
२९	किमिचौर सिंचाइ योजना	सुनिलस्मृति - ५, रोल्पा	१०००	९९९.७५६	सालवसाली
३०	तल्लो धम्जाखोला सिंचाइ योजना	सुनिलस्मृति - २, रोल्पा	१५००	१४९९.३५५	सालवसाली

३१	सारीखोला मोङ्ग सिंचाइ कुलो मर्मत	सुनिलस्मृति - ६, रोल्पा	५००	४९९.७२१	सालवसाली
३२	खाराखोला अमरगौरा अमिल्धारा साउनेखेत सिंचाइ योजना	सुनिलस्मृति - ३, रोल्पा	५००	४९९.८७२	सालवसाली
३३	मालझुङ्ग सिमलकुना बालुवा सिंचाइ योजना	माडी -४, रोल्पा	५००	०.००	सालवसाली
३४	कुरेली सिंचाइ योजना	परिवर्तन -१, रोल्पा	२००	१९९.९२५	सालवसाली
३५	डेरा जेमुरा सिमा सिंचाइ योजना	सुनिलस्मृति -१, रोल्पा	५००	४७८.५८८	सालवसाली
३६	चिडीखोला सिंचाइ योजना	रोल्पा -१, रोल्पा	५००	४९९.०५९	सालवसाली
३७	ओदाने पानीघाट सिंचाइ योजना	रोल्पा -५, रोल्पा	५००	४६२.८५५	सालवसाली
३८	गौराखुटी सिंचाइ योजना	रोल्पा -८, रोल्पा	५००	४७६.०३८	सालवसाली
३९	सिमाखोला सिंचाइ योजना	सुनिलस्मृति - ६, रोल्पा	५००	४७८.४६७	सालवसाली
४०	ओखेनी सालधारी रुन्टावाङ्ग सिंचाइ योजना	रोल्पा -४, रोल्पा	५००	४९९.९७९	सालवसाली
४१	विफेगैडाँ सिंचाइ योजना	त्रिवेणी - १, रोल्पा	५००	४९९.६१२	सालवसाली
४२	भित्रीखोला सिंचाइ योजना	त्रिवेणी - ३, रोल्पा	५००	४९९.३१६	सालवसाली
४३	खेवाङ्गखोला सिंचाइ योजना र ठाँटीखोला पुनरवाङ्ग सिंचाइ योजना	रोल्पा - ६, रोल्पा	५००	४९९.९८४	सालवसाली
४४	सालधारी छहराखोला सिंचाइ योजना	रोल्पा - ४, रोल्पा	५००	४९९.८५८	सालवसाली
४५	सिवाङ्गधारा सिंचाइ योजना	त्रिवेणी - १, रोल्पा	५००	४७९.५०२	सालवसाली
४६	मुलखोला देखी छहराखोला सिंचाइ योजना	रोल्पा - १, रोल्पा	५००	४८०.०८५	सालवसाली

४७	साततलेखोला देखी चिउरीबोट सिंचाइ योजना	रोल्पा - २, रोल्पा	५००	४९५.८८०	सालवसाली
४८	बाजिवाङ्ग सिंचाइ योजना	त्रिवेणी - ७, रोल्पा	५००	४७५.९०६	सालवसाली
४९	खवाङ्गपाछामा सिंचाइ पोखरी निर्माण	त्रिवेणी - ७, रोल्पा	४००	३८४.२३६	सालवसाली
५०	खोलाबाङ्ग कोरगाँउ सिंचाइ योजना	त्रिवेणी - ६, रोल्पा	५००	४८०.३३५	सालवसाली
५१	पानीघाट खरवान्नेखोला सिंचाइ योजना	त्रिवेणी - १, रोल्पा	५००	४७९.९०८	सालवसाली
५२	डिहिखेत स्याहाला सिंचाइ योजना	सुनिलस्मृति - ६, रोल्पा	१०००	९८५.२४७	सालवसाली
जम्मा			३६४००	३४९५६.१६१	

१३ .१.३ जलउत्पन्न प्रकोप न्यूनिकरण तथा व्यवस्थापन कार्यक्रम

रकम रु हजारमा

सि नं	योजनाको नाम	ठेगाना	आ. व. ०७८/७९ मा विनियोजित भएको रकम	आ. व. ०७८/७९ सम्म खर्च भएको रकम	कैफियत
१	सिबाँगखोला नियन्त्रण कार्य	त्रिवेणी - २ ५ ७	५०००	४२३७.५३८	सालवसाली
२	पाछाबाड खोला तटबन्ध कार्य	परिवर्तन-३, रोल्पा	५०००	४९४८.५१७	सालवसाली
३	आरडखोला तटबन्ध कार्य	रुन्टीगढी- ३, रोल्पा	५०००	४९९६.६१६	सालवसाली
४	सिस्नेरी पिपलबोट तटबन्ध कार्य	त्रिवेणी - ७, रोल्पा	१२५०	१२०१.१७९	सालवसाली

५	पतलखोला जाडलाड तटबन्ध कार्य	त्रिवेणी - १, रोल्पा	८३३	८१६.३९३	सालवसाली
६	लिउरीबाड माडीखोला तटबन्ध कार्य	माडी - ३, रोल्पा	८३३	८१४.१४५	सालवसाली
७	घुसवाडखोला तटबन्ध कार्य	सुनछहरी - १, रोल्पा	१२५०	१२०८.३४४	सालवसाली
८	सुखओडार खोला तटबन्ध कार्य	गगादेव - ४, रोल्पा	८३३	८१२.५०९	सालवसाली
९	पुत्लाचौर धामाचौर तटबन्ध कार्य	परिवर्तन - ५, रोल्पा	८३३	८०८.५२८	सालवसाली
१०	कुरेली तटबन्ध कार्य	परिवर्तन - १, रोल्पा	८३५	८०७.१९३	सालवसाली
११	माडीखोला चप्का तटबन्ध कार्य	परिवर्तन - ६, रोल्पा	१२५०	१२०९.२४४	सालवसाली
१२	उवा मलेगौरी तटबन्ध कार्य	थवाड - ४, रोल्पा	१२५०	९२३.७२५	सालवसाली
१३	भेडीखर्क तटबन्ध कार्य	परिवर्तन - ४, रोल्पा	८३३	८११.०६२	सालवसाली
१४	छेल्लेवाडखोला तटबन्ध कार्य	थवाड - २, रोल्पा	८३५	८१२.३३१	सालवसाली
१५	रिखोला तटबन्ध कार्य	थवाड - २, रोल्पा	८३३	७६१.४४१	सालवसाली
१६	मिरुलखोला तटबन्ध कार्य	थवाड - ३, रोल्पा	८३३	८०५.५०७	सालवसाली
१७	लापखोला तटबन्ध कार्य	रुन्टीगढी - १, रोल्पा	८३३	७९९.७२८	सालवसाली
१८	सिमविन तटबन्ध कार्य	रुन्टीगढी - १, रोल्पा	८३३	८००.०४९	सालवसाली
१९	उवातेलखोला तटबन्ध कार्य	थवाड - ४, रोल्पा	८३३	८१८.०५४	सालवसाली
२०	धाङ्सीखोला मेदी सेडावाड तटबन्ध कार्य	रोल्पा - १०, रोल्पा	१६६८	१६०१.७८२	सालवसाली

२१	रातामाटाखोला तटबन्ध कार्य	लुङ्ग्री - ४, रोल्पा	१६६६	१६०४.८८५	सालवसाली
२२	मबाङखोला तटबन्ध कार्य	सुनछहरी - ३, रोल्पा	१६६६	१६१०.०४५	सालवसाली
२३	बागमारा तटबन्ध तथा बसपार्क संरक्षण योजना	परिवर्तन - ३, रोल्पा	२०००	१९६६.०७१	सालवसाली
२४	विरुलफेद पहिरीखोला पहिरो रोकथाम कार्य	लुङ्ग्री - २, रोल्पा	२०००	१९६६.६२५	सालवसाली
२५	खारपानी जारीबाङ पालगाडे ओडार तटबन्ध कार्य	सुनिलस्मृति- ३, रोल्पा	१०००	९८०.६८२	सालवसाली
२६	लखना गनारी पलासे तटबन्ध कार्य	रुन्टीगढी - ३, रोल्पा	१०००	९८४.३६६	सालवसाली
२७	सारिघाट लामी दुहाली तटबन्ध कार्य	सुनिलस्मृति - २, रोल्पा	१०००	९७८.२६६	सालवसाली
२८	भैसीकोट उत्तिस्नेखोला नमुना मा वि संरक्षण	परिवर्तन - ५, रोल्पा	८००	७८८.३४४	सालवसाली
२९	ताराङ्गखोला तटबन्ध कार्य	परिवर्तन - १, रोल्पा	७००	६४१.८१७	सालवसाली
३०	स्वास्थ्य आमा समुह भवन संरक्षण	रोल्पा - २, रोल्पा	५००	४९३.०४१	सालवसाली
३१	थलिवाङ्ग फल्लेधारा तटबन्ध कार्य	रोल्पा - २, रोल्पा	५००	४९५.८२९	सालवसाली
३२	मदरखोला देखी गडेराखोला धाङ्सीखोला तटबन्ध कार्य	रोल्पा - २, रोल्पा	१५००	१४६३.४७९	सालवसाली
३३	कुटेखोला जिबैखोला र बाङ्गमाखोला कटान संरक्षण कार्य	थवाङ - ३, रोल्पा	१०००	९७७.१८२	सालवसाली
३४	धाङ्सीखोला सिगना वखाङ्ग खदावाङ्ग तटबन्ध कार्य	रोल्पा - २, रोल्पा	१०००	९८४.१४९	सालवसाली
३५	धाङ्सीखोला कटान तटबन्ध	रोल्पा - ४, रोल्पा	१०००	९८४.८७४	सालवसाली
३६	पिपलखोला छहरेखोला कटान संरक्षण	रोल्पा - ४, रोल्पा	५००	४९१.८०४	सालवसाली

३७	सिवाङ्गखोला सिंचाइ कुलो संरक्षण	त्रिवेणी - २, रोल्पा	५००	४९१.१३४	सालवसाली
३८	अधेरीखोला तटबन्ध कार्य	रोल्पा - ६, रोल्पा	१२००	११५३.१२९	सालवसाली
३९	अरुङखोला थातिचौर लाखुरीबास तटबन्ध कार्य	रुन्टीगढी ५, रोल्पा	८००	७१०.१६५	सालवसाली
४०	बाइजाखोला तटबन्ध कार्य	रुन्टीगढी - ५, रोल्पा	५००	४७४.६५४	सालवसाली
४१	साँपडाँडाखोला दोभान तटबन्ध कार्य	रुन्टीगढी - ६, रोल्पा	७००	६५४.२३४	सालवसाली
४२	बलवाङ्ग दशौदीटोल नयाँसडक तटबन्ध कार्य	रुन्टीगढी - ७, रोल्पा	७००	६६१.८६५	सालवसाली
४३	अरुङखोला तटबन्ध कार्य	रुन्टीगढी - ३, रोल्पा	५००	४८०.०३८	सालवसाली
४४	सुनछहरी पहिरो नियन्त्रण	सुनछहरी - १, रोल्पा	११००	१०८८.०२१	सालवसाली
जम्मा			५५५००.००	५३०८३.५०१	

१३.२ मझौला सिंचाइ योजना (संघ सशर्त)

१	ठुलोखुङ्ग सिंचाइ योजना	सुनिलस्मृति - २, रोल्पा	५०००.००	४९९८.७८६	
जम्मा			५०००.००	४९९८.७८६	

१४ आ व ०७८/७९ मा यस डिभिजन कार्यालय बाट सम्पादन गरेका कामको संरचनागत विवरण

१४.१ मझौला तथा वैकल्पिक प्रविधिमा आधारित सिंचाइ योजना

सि. नं.	योजनाको नाम	ठेगाना	आ व ०७८।७९ मा निर्माण भएका मुख्य संरचनाको विवरण
१	घान्द्रुखोला सिंचाइ योजना	रोल्पा - २, रोल्पा	Canal Lining = 1395m, Drop Structure=6No, Aquaduct=1No, Disselting Basin=1no, Pipe lining =350,RRM wall, Gabion work etc.
२	कलमखोला सिंचाइ योजना	सुनिलस्मृति - १, रोल्पा	Canal Lining = 1639 m, Intake = 1 No, Aquaduct=1No, Disselting Basin=1No, RRM wall, Gabion work etc.
३	लहरीखोला सिंचाइ योजना	माडी - ३, रोल्पा	Canal Lining = 1403 m, Intake = 1 No, Disselting Basin=1No, RRM wall =306m, Gabion work =76m etc.
४	चिउरीधारा सिंचाइ योजना	रोल्पा - १०, रोल्पा	Pipe Lining = 5492 m, Intake = 1 No, Disselting Basin=1 No, BBT=2 No, RVT = 5No, RRM wall, Gabion work etc.
५	दबसे लिफ्ट सिंचाइ योजना	लुङ्ग्री - २, रोल्पा	Intake =1 No. Pump House 1No., RVT = 1No
६	धम्पाखोला हरिगाँउ महेन्द्री सिंचाइ योजना	सुनिलस्मृति - २, रोल्पा	क्रमागत योजना अर्को वर्ष कार्य हुने ।
७	झागरखोला सिंचाइ योजना	त्रिवेणी - ५, रोल्पा	Canal Lining = 1743 m, Intake = 1 No, Aquaduct=1No, RRM wall =290 m, Gabion work etc.
८	गुनामखोला कालिजड धनचौर सिंचाइ योजना	रुन्टीगढी - १, रोल्पा	Canal Lining = 150 m
९	मनगाड सिंचाइ योजना	सुनिलस्मृति - ५, रोल्पा	Canal Lining = 523 m, RRM wall etc.

१०	दारखोला तित्रिकोट रुड्ता सिंचाइ योजना	रोल्पा - ४ ,रोल्पा	Canal Lining = 961 m, RRM wall , Gabion work etc.
११	धारापानी मुलावारी सिंचाइ योजना	रोल्पा - १ ,रोल्पा	Canal Lining = 821 m, RVT = 1No , Pipe Supply = 500m , Gabion work etc.
१२	तिनखेत सिंचाइ योजना	रुन्टीगढी - १ ,रोल्पा	Canal Lining = 147 m
१३	कुन्जरी सिंचाइ योजना लुङ्ग्री	लुङ्ग्री - ४ ,रोल्पा	Pipe Lining = 768 m, Chamber= 7 No , Gabion work etc.
१४	हुम्रीखोला सिंचाइ योजना	रोल्पा - ७ ,रोल्पा	Gabion Protection work=40m .
१५	कालाखोला सारङगे कोलवाड सिंचाइ योजना	त्रिवेणी - २, रोल्पा	Canal Lining = 218 m
१६	काट्ने घरवारीखेत सिंचाइ योजना	सुनिलस्मृति - ५, रोल्पा	Canal Lining = 236 m
१७	नेवारखेत सिंचाइ योजना	सुनिलस्मृति - ५, रोल्पा	Canal Lining = 159.5 m
१८	काट्नेखेत सिंचाइ योजना	सुनिलस्मृति - ५, रोल्पा	Pipe Lining = 1310 m, Intake Chamber= 1 No .
१९	डिहिखेत सिंचाइ योजना	सुनिलस्मृति - ६ ,रोल्पा	Canal Lining = 275.55 m
२०	धानकुना सिंचाइ योजना	रोल्पा - ५, रोल्पा	कार्य नभएको ।
२१	गोलकटेरी सिंचाइ योजना	त्रिवेणी - ३, रोल्पा	Canal Lining = 154 m

१४.२ सिंचाइ आयोजना मर्मत सुधार तथा विस्तार कार्यक्रम

रकम रु हजारमा

सि. नं.	योजनाको नाम	ठेगाना	आ व ०७८/७९ मा निर्माण भएका मुख्य संरचनाको विवरण
१	झिडिसल जलासय पोखरी	रोल्पा - ६, रोल्पा	RVT = 1 No
२	नन्दीखोला अधेरीखोला सिंचाइ योजना	त्रिवेणी - ७, रोल्पा	RVT = 1 No
३	द्रवेखोला बुर्तिवाड सिंचाइ योजना	त्रिवेणी - ७, रोल्पा	Canal Lining = 134 m etc.
४	हुङ्ग्रीखोला माडीचौर सिंचाइ योजना	रोल्पा - ७, रोल्पा	Canal Lining = 19m, Disselting Basin=1no
५	बगाले लाकुरी सिंचाइ योजना	त्रिवेणी - २, रोल्पा	Canal Lining = 151m ,RRM etc.
६	कुनापानी खुमेल सिंचाइ योजना	रोल्पा - ३, रोल्पा	Canal Lining = 246m ,RRM etc.
७	परेमा दर्कवाङ्ग सिंचाइ योजना	रोल्पा - ६, रोल्पा	Canal Lining = 186 m
८	पुवाखोला लुङ्सुसा लिसरीवाङ्ग धुनवोट सिंचाइ योजना	परिवर्तन - २, रोल्पा	Pipe Lining = 3900 m, Intake Chamber= 1 No , RVT = 1 No
९	धैरेनीखोला कुवरगाँउ पोखरी सिंचाइ योजना	त्रिवेणी - ७, रोल्पा	RVT = 1 No
१०	कालाखोला दोभान सारङ्गे कोलवोट सिंचाइ योजना	त्रिवेणी - २, रोल्पा	Canal Lining = 227m
११	परेमाखोला माडीचौर सिंचाइ योजना	रोल्पा - ७, रोल्पा	Canal Lining = 140 m
१२	महानेटा सिंचाइ योजना	गगादेव - ५, रोल्पा	RVP = 1 No
१३	निरही सिंचाइ योजना	लुङ्ग्री - ३, रोल्पा	Canal Lining = 249 m ,RRM etc.
१४	चिसाखोला भिग्रीपाटी सिंचाइ योजना	लुङ्ग्री - ३, रोल्पा	Canal Lining = 257m ,Gabion Protection etc.
१५	कर्णवर्ना ऐपे सिंचाइ योजना	लुङ्ग्री - १, रोल्पा	Pipe Lining = 6650 m, Intake Chamber= 3 No , BPT = 2 No

१६	कर्जाखोला देखी गणेश हेवाङ्गसम्म सिंचाइ योजना	रोल्पा - १०, रोल्पा	Pipe Lining = 565 m, Intake Chamber= 31No
१७	भनभनेखोलादेखी उद्वन पहिरासम्म सिंचाइ योजना	रोल्पा - १०, रोल्पा	Pipe Lining = 570 m, Intake Chamber= 3 No
१८	खन्च्याङ्ग धाङ्सीखोला सिंचाइ योजना	रोल्पा - १०, रोल्पा	Pipe Lining = 2000 m, Intake Chamber= 1 No, RVT=2 No
१९	कौछना सिंचाइ योजना	सुनिलस्मृति - ६, रोल्पा	Canal Lining = 98 m , RRM etc.
२०	खाराखोला दाइवाङ्ग सिंचाइ योजना	सुनिलस्मृति - ३, रोल्पा	Canal Lining = 209 m
२१	बागमारा सिंचाइ योजना	परिवर्तन - ३, रोल्पा	Canal Lining = 198 m, Gabion Protection etc.
२२	ऐलेखोला सिंचाइ योजना	परिवर्तन - ४, रोल्पा	Pipe Lining = 670 m, RVT=2 No
२३	माडी ओवाङ्ग सिंचाइ योजना	परिवर्तन - ६, रोल्पा	Pipe Lining = 2600 m, Intake Chamber= 1 No, RVT=1 No
२४	झालपोखरी निर्माण	परिवर्तन - २, रोल्पा	Pipe Lining = 2800 m, Intake Chamber= 1 No, RVT=1 No
२५	चिसापानी सामरी नारायणपूर गोठेडाँडा दिसनधारा सिंचाइ योजना	रुन्टीगढी - १, रोल्पा	Canal Lining = 220 m
२६	रिठेखोला लामाचौर सिंचाइ योजना	लुङ्ग्री - ३, रोल्पा	Pipe Crossing = 160 m, Chamber= 2 No.
२७	विदुङ्गचौका सिंचाइ योजना	लुङ्ग्री - ३, रोल्पा	Canal Lining =145 m , RRM etc.
२८	गद्देखोला सिंचाइ योजना	लुङ्ग्री - ५, रोल्पा	Canal Lining =245 m , RRM etc.
२९	किमिचौर सिंचाइ योजना	सुनिलस्मृति - ५, रोल्पा	Canal Lining =224 m , RRM etc.
३०	तल्लो धम्जाखोला सिंचाइ योजना	सुनिलस्मृति - २, रोल्पा	Canal Lining =248 m , RRM etc.
३१	सारीखोला मोङ्ग सिंचाइ कुलो मर्मत	सुनिलस्मृति - ६, रोल्पा	Canal Lining =88 m , RRM etc.
३२	खाराखोला अमरगैरा अमिल्धारा साउनेखेत सिंचाइ योजना	सुनिलस्मृति - ३, रोल्पा	Canal Lining = 172 m, Chamber= 1 No

३३	मालझुङ्ग सिमलकुना बालुवा सिंचाइ योजना	माडी - ४, रोल्पा	कार्य नभएको ।
३४	कुरेली सिंचाइ योजना	परिवर्तन - १, रोल्पा	Pipe Lining = 2800 m, Intake Chamber= 1 No, RVT=1 No
३५	डेरा जेमुरा सिमा सिंचाइ योजना	सुनिलस्मृति - १, रोल्पा	Canal Lining = 157m
३६	चिडीखोला सिंचाइ योजना	रोल्पा - १, रोल्पा	Canal Lining =21 m , RRM etc.
३७	ओदार्ने पानीघाट सिंचाइ योजना	रोल्पा - ५, रोल्पा	Masonry Lining =30 m , RRM etc.
३८	गौराखुटी सिंचाइ योजना	रोल्पा - ८, रोल्पा	Pipe Lining = 300 m, Intake Chamber= 1 No, RVT=1 No
३९	सिमाखोला सिंचाइ योजना	सुनिलस्मृति- ६, रोल्पा	Canal Lining = 159 m,Gabion Protection etc.
४०	ओखेनी सालघारी रुन्टावाङ्ग सिंचाइ योजना	रोल्पा - ४, रोल्पा	Canal Lining = 102 m
४१	विफेगैडाँ सिंचाइ योजना	त्रिवेणी - १, रोल्पा	Canal Lining = 120 m
४२	भित्रीखोला सिंचाइ योजना	त्रिवेणी - ३, रोल्पा	Intake Chamber= 3 No, Gabion Protection,RRM etc.
४३	खेवाङ्गखोला सिंचाइ योजना र ठाँटीखोला पुनरवाङ्ग सिंचाइ योजना	रोल्पा - ६, रोल्पा	Pipe Lining = 3570 m.
४४	सालधारी छहराखोला सिंचाइ योजना	रोल्पा - ४, रोल्पा	Canal Lining = 102 m
४५	सिवाङ्गधारा सिंचाइ योजना	त्रिवेणी - १, रोल्पा	Canal Lining = 119 m
४६	मुलखोला देखी छहराखोला सिंचाइ योजना	रोल्पा - १, रोल्पा	Canal Lining = 127 m
४७	साततलेखोला देखी चिउरीबोट सिंचाइ योजना	रोल्पा - २, रोल्पा	Pipe Lining = 2330 m.
४८	बाजिवाङ्ग सिंचाइ योजना	त्रिवेणी - ७, रोल्पा	Pipe Lining = 4100m, Intake Chamber= 1 No
४९	खवाङ्गपाछामा सिंचाइ पोखरी निर्माण	त्रिवेणी - ७, रोल्पा	Reservoir Pond =1 No
५०	खोलाबाङ्ग कोरगाँउ सिंचाइ योजना	त्रिवेणी - ६, रोल्पा	Canal Lining = 134 m

५१	पानीघाट खरबान्नेखोला सिंचाइ योजना	त्रिवेणी - १, रोल्पा	Canal Lining = 141 m
५२	डिहिखेत स्याहाला सिंचाइ योजना	सुनिलस्मृति - ६, रोल्पा	Canal Lining = 352 m, Chaber=1 no. etc.

१४.३ जलउत्पन्न प्रकोप न्यूनिकरण तथा व्यवस्थापन कार्यक्रम

सि. नं.	योजनाको नाम	ठेगाना	आ व ०७८।७९ मा निर्माण भएका मुख्य संरचनाको विवरण
१	सिर्बाङखोला नियन्त्रण कार्य	त्रिवेणी - २ ५ ७	Gabion Revetment = 564m
२	पाछाबाड खोला तटबन्ध कार्य	परिवर्तन - ३, रोल्पा	Gabion Revetment = 369 m
३	आरडखोला तटबन्ध कार्य	रुन्टीगढी- ३, रोल्पा	Gabion Revetment = 297 m
४	सिस्नेरी पिपलबोट तटबन्ध कार्य	त्रिवेणी - ७, रोल्पा	Gabion Revetment = 130 m
५	पतलखोला जाडलाड तटबन्ध कार्य	त्रिवेणी - १, रोल्पा	Gabion Revetment = 60 m
६	लिजरीबाड माडीखोला तटबन्ध कार्य	माडी -३, रोल्पा	Gabion Revetment = 60 m
७	घुसवाडखोला तटबन्ध कार्य	सुनछहरी- १, रोल्पा	Gabion Revetment = 91 m
८	सुखओडार खोला तटबन्ध कार्य	गगादेव -४, रोल्पा	Gabion Revetment = 57 m
९	पुत्लाचौर धामाचौर तटबन्ध कार्य	परिवर्तन -५, रोल्पा	Gabion Revetment = 60 m
१०	कुरेली तटबन्ध कार्य	परिवर्तन -१, रोल्पा	Gabion Revetment = 120 m
११	माडीखोला चप्का तटबन्ध कार्य	परिवर्तन -६, रोल्पा	Gabion Revetment = 96 m
१२	उवा मलेगौरी तटबन्ध कार्य	थबाड -४, रोल्पा	Gabion Revetment = 165 m
१३	भेडीखर्क तटबन्ध कार्य	परिवर्तन -४, रोल्पा	Gabion Revetment = 105 m
१४	छेर्लेवाडखोला तटबन्ध कार्य	थबाड -२, रोल्पा	Gabion Revetment = 129 m

१५	रिखोला तटबन्ध कार्य	थबाड -२, रोल्पा	Gabion Revetment = 69 m
१६	मिरुखोला तटबन्ध कार्य	थबाड -३, रोल्पा	Gabion Revetment = 126 m
१७	लापखोला तटबन्ध कार्य	रुन्टीगढी -१, रोल्पा	Gabion Revetment = 135 m
१८	सिमविन तटबन्ध कार्य	रुन्टीगढी -१, रोल्पा	Gabion Revetment = 120 m
१९	उवातेलखोला तटबन्ध कार्य	थबाड -४, रोल्पा	Gabion Revetment = 120 m
२०	धाङ्सीखोला पेदी सेडावाड तटबन्ध कार्य	रोल्पा -१०, रोल्पा	Gabion Revetment = 70 m
२१	रातामाटाखोला तटबन्ध कार्य	लुङ्ग्री- ४, रोल्पा	Check Dam = 14 Nos
२२	मवाङखोला तटबन्ध कार्य	सुनछहरी- ३, रोल्पा	Check Dam = 4 Nos, Revetment = 165 m
२३	बागमारा तटबन्ध तथा बसपार्क संरक्षण योजना	परिवर्तन -३, रोल्पा	Gabion Revetment = 90 m
२४	विरुलफेद पहिरीखोला पहिरो रोकथाम कार्य	लुङ्ग्री -२, रोल्पा	Check Dam = 2 Nos, Revetment = 57 m
२५	खारपानी जारीवाड पालगाडे ओडार तटबन्ध कार्य	सुनिलस्मृति -३, रोल्पा	Gabion Revetment = 148 m
२६	लखना गनारी पलासे तटबन्ध कार्य	रुन्टीगढी -३, रोल्पा	Check = 1 Nos, Revetment = 48 m
२७	सारिघाट लामी दुहाली तटबन्ध कार्य	सुनिलस्मृति - २, रोल्पा	Gabion Revetment = 63 m
२८	भैसीकोट उतिस्नेखोला नमुना मा वि संरक्षण	परिवर्तन -५, रोल्पा	Gabion Revetment = 45 m
२९	ताराङ्गखोला तटबन्ध कार्य	परिवर्तन -१, रोल्पा	Gabion Revetment = 150 m
३०	स्वास्थ्य आमा समुह भवन संरक्षण	रोल्पा -२, रोल्पा	Massonry Drain =11m,RRM Retaining Wall
३१	थलिवाङ्ग फल्लेधारा तटबन्ध कार्य	रोल्पा -२, रोल्पा	Massonry Drain =13m,RRM Retaining Wall

३२	मदरखोला देखी गडेराखोला धाड्सीखोला तटबन्ध कार्य	रोल्पा -२, रोल्पा	Gabion Revetment = 60 m, Stud=4 No
३३	कुटेखोला जिबैखोला र बाङ्गमाखोला कटान संरक्षण कार्य	थवाङ -३, रोल्पा	Gabion Revetment = 155m
३४	धाड्सीखोला सिगना वखाङ्ग खदावाङ्ग तटबन्ध कार्य	रोल्पा -२, रोल्पा	Gabion Revetment = 45m ,Stud=2No
३५	धाड्सीखोला कटान तटबन्ध	रोल्पा -४, रोल्पा	Gabion Revetment = 33 m
३६	पिपलखोला छहरेखोला कटान संरक्षण	रोल्पा -४, रोल्पा	Gabion Retaining = 16 m
३७	सिवाङ्गखोला सिंचाइ कुलो संरक्षण	त्रिवेणी -२, रोल्पा	Gabion Intake = 51 m
३८	अधेरीखोला तटबन्ध कार्य	रोल्पा -६, रोल्पा	Gabion Retaining = 58 m
३९	अरुङखोला थातिचौर लाखुरीवास तटबन्ध कार्य	रुन्टीगढी -५, रोल्पा	Check Dam = 1 Nos, Revetment = 77 m
४०	बाइजाखोला तटबन्ध कार्य	रुन्टीगढी -५, रोल्पा	Gabion Revetment = 67 m
४१	साँपडाँडाखोला दोभान तटबन्ध कार्य	रुन्टीगढी - ६, रोल्पा	Gabion Revetment = 51 m
४२	बलवाङ्ग दशौदीटोल नयाँसडक तटबन्ध कार्य	रुन्टीगढी -७, रोल्पा	RRM Retaining Wall=15m
४३	अरुङखोला तटबन्ध कार्य	रुन्टीगढी- ३, रोल्पा	Gabion Revetment = 63 m
४४	सुनछहरी पहिरो नियन्त्रण	सुनछहरी -१, रोल्पा	Check Dam , Revetment

१४.१ मझौला सिंचाइ योजना (संघ सशर्त)

सि नं	योजनाको नाम	ठेगाना	आ व ०७८।७९ मा निर्माण भएका मुख्य संरचनाको विवरण
१	ठुलुखुङ्ग सिंचाइ योजना	सुनिलस्मृति -२, रोल्पा	. Canal Lining = 743 m, RRM Retaining =14.3m

१५ कार्यक्रमगत खुद परिमाणात्मक वार्षिक प्रगति विवरण आ व ०७८/७९

सि नं	कार्यक्रमको नाम	सिंचाइ बाँध/मुहान	पक्की नहर कुलो	पाइप लाइनिङ	थप सिंचाइ सेवा पुगेको क्षेत्र	सिंचाइ संरचन सुध्द्रीकरण गरेको क्षेत्र	नदी नियन्त्रण तटबन्ध निर्माण	नदी नियन्त्रण बाट उकास भएको जमिन	तटबन्धबाट सुरक्षित भएको घर जमिन
क	समानिकरण	वटा	कि. मि.	कि. मि.	हे.	हे.	कि. मि.	हे.	घर हे.
१	मझौला तथा बैकल्पिक प्रविधिमा आधारित सिंचाइ योजना	४	९.८२५	६.७६	६५	१६३			
२	सिंचाइ योजना मर्मत संभार तथा विस्तार कार्यक्रम		५.१८	३३.१		३७८			
३	जलउत्पन्न प्रकोप व्यवस्थापन कार्यक्रम						४.४१	६	३१८ २५५
समानिकरण जम्मा			१५.००५	३९.७७	६५	५४१	४.४१	६	३१८ २५५
ख	संघ सशर्त								
१	मझौला सिंचाइ योजना		०.७४३			८०			
	संघ सशर्त जम्मा		०.७४३			८०			
कुल जम्मा (क+ख)			१५.७४८	३९.७७	६५	६२१	४.४१	६	३१८ २५५

१६ बेरुजु सम्बन्धि विवरण (प्रदेश कार्यालय स्थापना हुनु पूर्वको)

रु हजारमा

क्र. सं.	बेरुजुको किसिम	जम्मा बेरुजु रकम आ.व. ०७७/७८ सम्म	हाल सम्म फछ्यौट रकम	फछ्यौट प्रतिसत	कैफियत
१	असुल उपर गर्नुपर्ने	५१६.११४	२१.४६९	४.१५%	
२	नियमित गर्नु पर्ने	८८९९.८८			
३	पेशकी				
	कुल जम्मा	९४१५.९९४	२१.४६९		

१७ बेरुजु सम्बन्धि विवरण (प्रदेश कार्यालय स्थापना पछीको)

रु हजारमा

क्र. सं.	बेरुजुको किसिम	जम्मा बेरुजु रकम आ.व. ०७७/७८ सम्म	हाल सम्म फछ्यौट रकम	फछ्यौट प्रतिसत	कैफियत
१	असुल उपर गर्नुपर्ने	७८.६३१	५१.६२४	६५.६५%	
२	नियमित गर्नु पर्ने	३५९.७५८	३५९.७५८	१०० %	
३	पेशकी	४९३६.००	४९३६.००	१०० %	
	कुल जम्मा	५३७४.३८९	५३४७.१८४	९९.४९%	

१८ आ व ०७८।७९ मा यस डिभिजन कार्यालयबाट सिंचाइ तथा नदी नियन्त्रणका अन्तर्गत DPR भएका योजनाहरू

सि. नं.	योजनाका नाम	ठेगाना	कैफियत
१	तिनखोला सिंचाइ योजना	परिवर्तन -१, रोल्पा	
२	बाँधकुलो सिंचाइ योजना	त्रिवेणी -५, रोल्पा	
३	चिसापानी सामरी नारायणपूर गोठेडाँडा दिसनधारा सिंचाइ योजना	रुन्टीगढी -१, रोल्पा	
४	खैरेनीमुल सुनारडेरा धउलीगाँउ सिंचाइ योजना	सुनिलस्मृति -५, रोल्पा	
५	चिसाखोला भिग्रीपाटी सिंचाइ योजना	लुङ्ग्री -३, रोल्पा	
६	पाछावाड खोला नियन्त्रण	परिवर्तन -३, रोल्पा	

१९ आ व ०७८/७९ मा ठेक्का म्याद भन्दा अगाडी काम सम्पन्न गरी यस डिभिजन कार्यालय बाट सम्मानित हुने निर्माण व्यवसायिको नामावली

सि. नं.	निर्माण व्यवसायिको नाम	ठेक्का नम्बर	योजनाको नाम	प्रोपाइटरको नाम	ठेक्का सम्झौता मिति	ठेक्का सम्पन्न गर्नुपर्ने मिति	ठेक्का सम्पन्न मिति
१	के एण्ड यमुन कन्स्ट्रक्सन लुङ्ग्री ५		कलमखोला सिंचाइ योजना सुनिलस्मृति -१ रोल्पा	सत्यमान गुरुङ	२०७८/०३/०३	२०७९/०३/२५	२०७९/११/२२
२	जलजला न्यू प्रविन जे भि		लहरीखोला सिंचाइ योजना माडी -३ रोल्पा	मान बहादुर खत्री	२०७८/०३/०३	२०७९/०३/२५	२०७९/१२/२१

२०. आ.व. ०७७/७८ मा यस डिभिजन कार्यालयबाट सम्पादन गरेको कामको विवरण (योजनामा विनियोजित रकम र खर्च)

२०.१ प्रदेश समानिकरण अन्तर्गत

२०.१.१ मझौला तथा वैकल्पिक प्रविधिमा आधारित सिंचाइ योजना

सि नं	योजनाको नाम	ठेगाना	आ व ०७७/७८ को विनियोजित बजेट रु हजारमा	आ व ०७७/७८ भएको खर्च रु हजारमा	कैफियत
१	परेमाखोला सिंचाइ योजना	रोल्पा -७, रोल्पा	१०००	९९४.२४७	एप्राइजल बमोजिम योजना सम्पन्न
२	चिउरागाड सिंचाइ योजना	त्रिवेणी-१, रोल्पा	६०५०	५३६०.९८२	एप्राइजल बमोजिम योजना सम्पन्न
३	किलाचौर सिंचाइ योजना	लुङ्ग्री -५, रोल्पा	४५००	४२५६.८११	एप्राइजल बमोजिम योजना सम्पन्न

४	धनुवा सिंचाइ योजना	सुनिलस्मृति -६, रोल्पा	११६४०	१०८४१.१४०	एप्राइजल बमोजिम योजना सम्पन्न
५	घोडेखोला सिंचाइ योजना	सुनिलस्मृति -१, रोल्पा	१२८१४	१२३८१.३०१	एप्राइजल बमोजिम योजना सम्पन्न
६	घान्टुखोला सिंचाइ योजना	रोल्पा -२, रोल्पा	४७००	४५४६.५३०	क्रमागत
७	कलमखेला सिंचाइ योजना	सुनिलस्मृति -१, रोल्पा	४३००	४१३७.७२५	क्रमागत
८	चिउरीधारा सिंचाइ योजना	रोल्पा -१०, रोल्पा	१००	०.००	क्रमागत
९	दबसे लिफ्ट सिंचाइ योजना	लुङ्ग्री -२, रोल्पा	१००	०.००	क्रमागत
१०	लहरीखोला सिंचाइ योजना	माडी -३, रोल्पा	१३००	१३००	क्रमागत
जम्मा			४६५०४.००	४३८१८.७३६	

२०.१.२ सिंचाइ आयोजना मर्मत सुधार तथा बिस्तार कार्यक्रम मर्मत

सि नं	योजनाको नाम	ठेगाना	आ. व. ०७७/७८ को विनियोजित बजेट रु हजारमा	आ. व. ०७७/७८ भएको खर्च रु हजारमा	कैफियत
१	रिखोला बुर्तिबाङ्ग झिम पोवङ्ग सिंचाइ योजना	सुनछहरी- ७, रोल्पा	१३३०	१२७७.८०५	सालवसाली
२	धम्पाखोला हरिगाँउ महेन्द्री सिंचाइ योजना	सुनिलस्मृति -२, रोल्पा	८००	७३४.७५८	सालवसाली
३	लाखुरीबोट सिंचाइ योजना	रोल्पा -४, रोल्पा	७००	६३७.९७३	सालवसाली
४	खरीखोला उपल्लोखेत सिंचाइ योजना	लुङ्ग्री -३, रोल्पा	७००	६३७.१५८	सालवसाली

५	लहरीखोला सिमखेत सिंचाइ योजना	रोल्पा -४, रोल्पा	५००	४७२.३२७	सालवसाली
६	घोडेखोला बालकोट माडीचौर सिंचाइ योजना	सुनिलस्मृति -१, रोल्पा	५००	४७८.३०४	सालवसाली
७	सातखोला छिर्नी सिंचाइ योजना	सुनिलस्मृति -४, रोल्पा	४००	३८२.८३१	सालवसाली
८	उदानी पानीघाट सिंचाइ योजना	रोल्पा -५, रोल्पा	५००	४७८.८०५	सालवसाली
९	रिठेखोला सिंचाइ योजना	लुङ्ग्री -३, रोल्पा	२०००	१९१८.२५४	सालवसाली
१०	बङ्गगुरखोर सिंचाइ योजना	रोल्पा -४, रोल्पा	२०००	१८९१.७०८	सालवसाली
११	विफेगौना सिंचाइ योजना	त्रिवेणी -१, रोल्पा	५००	३९६.९६३	सालवसाली
१२	किमिचौर सिंचाइ योजना	सुनिलस्मृति -५, रोल्पा	१०००	९५८.१८६	सालवसाली
१३	बिदुङ्गचौका सिंचाइ योजना	लुङ्ग्री -५, रोल्पा	३५७०	३५१४.६४९	सालवसाली
१४	द्वेखोला सिंचाइ योजना	त्रिवेणी -७, रोल्पा	५००	४७८.१६८	सालवसाली
जम्मा			१५०००	१४२५७.८८९	

२०.१.३ आकास्मिक प्राकृतिक प्रकोप नियन्त्रण कार्यक्रम

सि नं	योजनाको नाम	ठेगाना	आ. व. ०७७/७८ को विनियोजित बजेट रु हजारमा	आ. व. ०७७/७८ भएको खर्च रु हजारमा	कैफियत
१	सुनछहरी पहिरो नियन्त्रण	सुनछहरी -१, रोल्पा	१००००	८५४४.३६७	सालवसाली
२	घङ्गारुवारी लघु जलविधुत् संरक्षण कार्य	थवाङ्ग -३ मिरुल	२२००	२११९.०२१	सालवसाली
३	कुरेलीखोला नियन्त्रण कार्य	परिवर्तन-१, रोल्पा	२०००	१९१२.८१९	सालवसाली
४	अराङ्गखोला नियन्त्रण कार्य	रुन्टीगढी -३, रोल्पा	१४५०	१२०८.९२९	सालवसाली

५	लहरीखोला नियन्त्रण कार्य	रोल्पा -१, रोल्पा	१४५०	१३००.१०१	सालवसाली
६	गजुलखोला नियन्त्रण कार्य	सुनिलस्मृति -३, रोल्पा	१४५०	११८२.२२९	सालवसाली
७	माडीखोला नियन्त्रण कार्य	रोल्पा -७, रोल्पा	१४५०	१२३०.९४४	सालवसाली
८	पधेरीखोला नियन्त्रण	रोल्पा -४, रोल्पा	१०००	९४८.२९१	सालवसाली
९	आकस्मिक जलउत्पन्न प्रकोपको लागि ग्याविन सप्लाई गर्ने कार्य	रोल्पा जिल्ला	१०००	९०८.०३५	सालवसाली
१०	खाराखोला अमरगौरा तटबन्ध	सुनिलस्मृति -३, रोल्पा	१०००	९२४.२५३	सालवसाली
११	सारिघाट तटबन्ध	सुनिलस्मृति -२, रोल्पा	१०००	७५९.३२३	सालवसाली
१२	चालाबाड खोला नियन्त्रण	सुनछहरी -२, रोल्पा	१०००	९५४.४५२	सालवसाली
जम्मा			२५०००.००	२१९९२.७६४	

२०.२ संघ सशर्त अन्तर्गत

२०.२.१ मझौला सिंचाइ योजना

सि नं	योजनाको नाम	ठेगाना	आ. व. ०७७/७८ को विनियोजित बजेट रु. हजारमा	आ. व. ०७७/७८ भएको खर्च रु. हजारमा	कैफियत
१	गोगनपानी सिंचाइ योजना	माडी , रोल्पा	१०००	९७७.५२७	
२	छापदुङ्गा सिंचाइ योजना	रोल्पा -४ ,रोल्पा	१०००	९८१.९९०	
३	ठुलोखुङ्ग सिंचाइ योजना	सुनिलस्मृति -२, रोल्पा	१५०००	१४९९३.६४२	ठेक्का बमोजिमको कार्य सम्पन्न
४	खुमेलगाड ओडार सिंचाइ योजना	सुनिलस्मृति -६, रोल्पा	१५००	१२९३.३४६	
जम्मा			१८५००.००	१८२८६.५०५	

२१ कार्यक्रमगत खुद परिमाणात्मक वार्षिक प्रगति विवरण आ व ०७७/७८

सि नं	कार्यक्रमको नाम	सिंचाइ बाधै/मुहान	पक्की नहर कुलो	पाइप लाइनिङ	थप सिंचाइ सेवा पुगेको क्षेत्र	सिंचाइ संरचन सुध्दिीकरण गेरेको क्षेत्र	नदी नियन्त्रण तटबन्ध निर्माण	नदी नियन्त्रण बाट उकास भएको जमिन	तटबन्धबाट सुरक्षित भएको घर जमिन
क	समानिकरण	बटा	कि. मि.	कि. मि.	हे.	हे.	कि. मि.	हे.	घर हे.
१	मझौला तथा बैकल्पिक प्रविधिमा आधारित सिंचाइ योजना	२	८.७		१०	१९०			
२	सिंचाइ योजना मर्मत संभार तथा विस्तार कार्यक्रम		३.०६	०.५२	५	१३५			
३	जलउत्पन्न प्रकोप व्यवस्थापन कार्यक्रम						१.४५	५	४५० १९
समानिकरण जम्मा		२	११. ७६	०.५२	१५	३४५	१.४५	५	४५० १९
ख	संघ सशर्त								
१	मझौला सिंचाइ योजना		३.९५						
संघ सशर्त जम्मा			३.९५						
कुल जम्मा (क +ख)		२	१५. ७१	०.५२	१५	३४५	१.४५	५	४५० १९

२२ पहाडी साना किसानका लागि अनुकूलन आयोजना, जिल्ला आयोजना समन्वय ईकाई
रोल्पा बाट आ व ०७८/७९ मा सम्पादन गरिएका सिंचाइ योजना सम्बन्धि विवरण

सि नं	योजनाको नाम	ठेगाना	विनियोजित बजेट रु हजारमा	ASHA Grant	संरचनागत विवरण
१	बेरुवावोट सिंचाइ योजना	त्रिवेणी -५, रोल्पा	७९२.२१४	५५३.४१०	Canal Lining = 240 m .
२	ख्यारा सिंचाइ पोखरी	सुनिलस्मृति -५, रोल्पा	४४१.३९५	२३८.७८८	Pond = 1 No
३	निम्ररीखोला सिंचाइ योजना	रोल्पा -७, रोल्पा	८९०.०९९	६४४.२६०	Canal Lining = 280m .
४	रनइ सिंचाइ पोखरी	रोल्पा -६, रोल्पा	४६६.४३६	३५५.४०९	Pond = 1 No, Pipe lining =35m
५	रिजालटोल सिंचाइ योजना	सुनिलस्मृति- १, रोल्पा	१०१७.१४२	७७७.०८८	Canal Lining = 280m , Pipe lining =900m
६	बेसुरी सिंचाइ पोखरी	गगांदेव -१, रोल्पा	४७९.२९४	३७१.००१	Pond = 1 No
७	हलङ्गा सिंचाइ योजना	त्रिवेणी -७ ,रोल्पा	१५१२.२५०	४००.००	Canal Lining = 500 m
८	खर्कधारा सिंचाइ योजना	त्रिवेणी - २, रोल्पा	१५५०.११५	५००.००	Canal Lining = 550 m , Pipe lining = 830 m
९	बान्चे सिंचाइ योजना	माडी -५, रोल्पा	६८०.५५६	२८५.७८९	Pipe lining = 2480 m
१०	तल्लो सगिरा सिंचाइ पोखरी	माडी -६, रोल्पा	४०५.५२८	३१३.७०२	Pond = 1 No
११	खोरवारे सिंचाइ पोखरी	माडी -१, रोल्पा	६२५.५३२	४८३.७७१	Pond = 1 No
जम्मा			८८६०.५६१	४९४३.२१८	

२३ नेपाल ग्रामिण पुननिर्माण संस्था (RRN) रोल्पा बाट आ व ०७८/७९ मा सम्पादन गरिएका सिंचाइ योजना सम्बन्धि विवरण

सि नं	योजनाको नाम	ठेगाना	आ व ०७८/७९ मा खर्च रकम (रु. हजारमा)	संरचनागत विवरण
१	रुडखोला सिंचाइ कुलो निर्माण योजना	रुन्टीगढी -९, अमिल्चौर रोल्पा	७३०.३०९	RCC Canal Lining
२	घटिडखोला तेलवाड सिंचाइ कुलो निर्माण योजना	रुन्टीगढी-१,तेलवाड रोल्पा	८२६.३३०	RCC Canal Lining
३	नौलाथोक खारा सिंचाइ कुलो मर्मत निर्माण योजना	रुन्टीगढी -६, खारा रोल्पा	७९०.१९४	Aqueduct & Gabion Protection
४	चिप्लेबाटो पाचमेरे सिंचाइ कुलो निर्माण योजना	त्रिवेणी - ३, छाप रोल्पा	१२२१.११८	RCC Canal Lining
५	सल्लाबोट सिंचाइ कुलो निर्माण योजना	त्रिवेणी - ६,पाछावाड रोल्पा	८६८.०५१	RCC Canal Lining
६	खरिबोट सिंचाइ कुलो निर्माण योजना	त्रिवेणी - ४, जिउला रोल्पा	९६६.७२५	RCC Canal Lining
७	खर्कधारा सिंचाइ कुलो निर्माण योजना	त्रिवेणी -२, खर्कधारा रोल्पा	५४५.६७०	RCC Canal Lining
८	हलङ्गा सिंचाइ कुलो निर्माण योजना	त्रिवेणी - ७, हलङ्गा रोल्पा	५२८.५४८	RCC Canal Lining
९	घट्टेकुलो सिंचाइ कुलो निर्माण योजना	त्रिवेणी -५, लापडाँडा रोल्पा	१०९१.४२०	RCC Canal Lining
१०	माछीखोला सुगरे सिंचाइ कुलो निर्माण योजना	रुन्टीगढी -७, खाक्सिबन रोल्पा	७५१.८६१	RCC Canal Lining
जम्मा			८३२०.२२६	

२४ माडी लुङ्ग्री कोरिडोर सिंचाइ आयोजना रोल्पा बाट आ व ०७८/७९ मा सम्पादन गरिएका सिंचाइ योजना सम्बन्धि विवरण

सि नं	योजनाको नाम	ठेगाना	विनियोजित रकम (रु हजारमा)	खर्च रकम (रु हजारमा)	संरचनागत विवरण
१	सिम्ले लिफ्ट सिंचाइ योजना १२ हे	रोल्पा -५, रोल्पा	३५००	३२००	Sump well=1 Irri. pond =1
२	चोबाङ लिफ्ट सिंचाइ योजना १२ हे	लुङ्ग्री ५, रोल्पा	३५००	३२००	Sump well=1 Irri. pond =1
३	कौलेखोला सिंचाइ योजना १५ हे	रुन्टीगढी -१, रोल्पा	३५००	३४००	Canal lining=900 m
४	सटिघाट बग्मा सिसाबोट सिंचाइ योजना ३० हे	रुन्टीगढी -५, रोल्पा	७०००	६८००	Canal lining=900 m
५	सेरा सिंचाइ योजना २५ हे	लुङ्ग्री -५, रोल्पा	२५००	२५००	Canal lining=900 m
६	विस्तुरी खोला छेङ्गा सिंचाइ योजना २५ हे	लुङ्ग्री -२, रोल्पा	५५००	५४००	Canal lining=900 m
७	सल्लेरी सिंचाइ योजना २० हे	लुङ्ग्री -३, रोल्पा	२०००	२०००	Canal lining=900 m
८	च्यूरापाखा सिंचाइ योजना २५ हे	लुङ्ग्री -३, रोल्पा	२०००	२०००	Canal lining=900 m
९	पानीचारखोला सिंचाइ योजना ८ हे	सुनिलस्मृति -४ रोल्पा	३००	३००	Canal lining=90 m
१०	खाराखोलाडाडाँ सिंचाइ योजना ५ हे	सुनिलस्मृति -३, रोल्पा	६००	६००	Canal lining=180 m
११	सेवाँडखोला साउनेखेत सिंचाइ योजना ५ हे	सुनिलस्मृति -३, रोल्पा	६००	६००	Irri. pond =1
१२	खुङ्ग्री पेदीखेत सिंचाइ योजना १० हे	सुनिलस्मृति -२ रोल्पा	७००	७००	Canal lining=180 m
१३	खुङ्ग्रीचौर लिफ्ट सिंचाइ योजना	सुनिलस्मृति -२ रोल्पा	५००	५००	Controler Fiting
जम्मा			३२२००	३१२००	

२५ समस्याहरू :

- निर्माण कार्यको गुणस्तर परिक्षण (Lab Test) को लागि रुपन्देही र दाङ स्थित सडक कार्यालय र निजि प्रयोगशालामा पठाउनु पर्ने भएकोले निकै कठिनाई भएको ।
- योजना स्वीकृति बेला राखिने ३ % जनश्रमदान बापत को कार्य गराउन कठिनाई भएको ।
- सिचाई कुलो मर्मत सम्बन्धि र जलउत्पन्न सम्बन्धि कार्यको माग अत्यधिक रहेकोमा कार्यालयबाट सम्बोधन गर्न नसकिएको ।
- सडक पूर्वाधारको अव्यवस्थित निर्माणले गर्दा सिचाई कुलोमा अत्यधिक क्षति पुग्ने गरेको ।

२६ समस्या समाधानका उपायहरू :

- कार्यालयमै आवश्यक जनशक्ति सहित प्रयोगशालाको व्यवस्था गर्नु पर्ने ।
- योजना स्वीकृति बेला राखिने ३ % जनश्रमदान बापत को कार्य नितिगत रुपमै कम गर्नु पर्ने
- सिचाई कुलो मर्मत सम्बन्धि र जलउत्पन्न सम्बन्धि कार्यको मागलाई सम्बोधन गर्न कार्यालयमै एकमुष्ट पर्याप्त बजेटको व्यवस्था गर्नु पर्ने ।
- सडक निर्माण गर्दा क्षतिहुने सिचाई योजनामा सोही निकायलाई जिम्मेवार बनाउन नितिगतरुपमै व्यवस्था गर्नु पर्ने ।

२७ यस कार्यालय स्थापना भएदेखी हाल सम्म कार्यरत डिभिजन प्रमुखहरूको नामावली विवरण

सि नं	नाम थर	पद	देखी	सम्म
१	मेघराज ज्ञवाली	डिभिजन प्रमुख	२०७५ / ०५ / १४	२०७६ / ०४ / १५
२	पुरुषोत्तम प्रसाद उपाध्याय	डिभिजन प्रमुख	२०७६ / ०५ / २०	२०७७ / १० / ३०
३	भेषराज भुसाल	निमित्त डिभिजन प्रमुख	२०७७ / ११ / १०	हाल सम्म

२८. यस कार्यालयको डिभिजन प्रमुख र सुचना अधिकारीको नाम र पद :



डिभिजन प्रमुख

नाम : श्री भेषराज भुसाल

पद : निमित्त डिभिजन प्रमुख

सम्पर्क नं : ९८५७८२०३९८



सुचना अधिकारी

नाम : श्री राजकुमार सापकोटा

पद : अधिकृत छैठौं

सम्पर्क नं : ९८५७८७७०२०

यस कार्यालयको विधुतिय पोर्टल :

फोन नम्बर ०८६ ४४०३९८

ईमेल : widd.rolpa@gmail.com

वेबसाइट : widdrolpa.lumbini.gov.np

फेसबुक : Wridd Rolpa

केही तस्विरहरू



कलमखोला सिंचाइ योजना सुनिलस्मृति १ रोल्पा



घान्द्रुखोला सिंचाइ योजना रोल्पा २ रोल्पा

सालघारी रुन्टाबाङ्ग सिंचाइ योजना रोल्पा ४ रोल्पा



धारापानी मुलाबारी सिंचाइ योजना रोल्पा १ रोल्पा




आरडखोला तटबन्ध कार्य रुन्टीगढी ३ रोल्पा



रातामाटाखोला पहिरो नियन्त्रण लुङ्ग्री ४ रोल्पा

पाछावाडखोला तटबन्ध परिवर्तन ३ रोल्पा

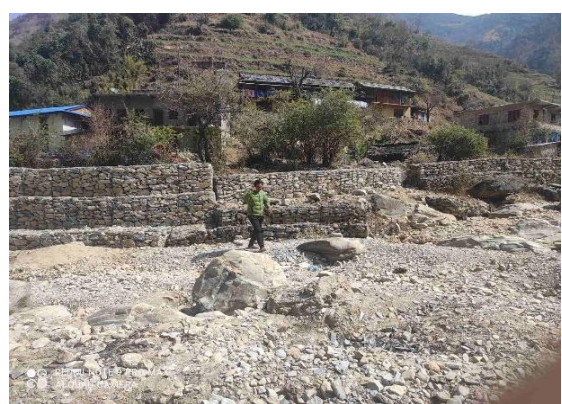

बागमारा बसपार्क संरक्षण परिवर्तन ३ रोल्पा

मिरुलखोला तटबन्ध थबाङ्ग ३ रोल्पा



लहरीखोला सिंचाइ योजना माडी ३ रोल्पा डिसेलिटङ्ग बेसीन



माननिय राज्यमन्त्रिज्यू बाट ठुलोखुङ्ग सिंचाइ योजनाको अनुगमन तथा निर्देशन गर्नु हुदै



आराङ्ग खोला तटबन्ध रुन्टीगढी ३ रोल्पा



माननिय मन्त्रीज्यू प्रमुख जिल्ला अधिकारीज्यू सुरक्षानिकायका प्रमुखज्यूहरुबाट कार्यालयको अनुगमन गर्दै ।



झागरखोला सिंचाइ योजना त्रिवेणी ५ रोल्पा



ठेक्का म्याद अगावै कार्य सम्पन्न गर्ने निर्माण व्यवसायि लाई सम्मान गरिदै ।



संस्थागत विकास तथा कृषि तालिममा सहभागिहरु



माननिय मन्त्रीज्यू, प्रमुख जिल्ला अधिकारीज्यू, सुरक्षा निकायका प्रमुखज्यूहरुबाट योजनाको अनुगमन गर्दै



लिबाङ बजार, रोल्पा

- कृषिको आधार : सिंचाइमा सुधार ।
- सिंचाइ गरौं : उत्पादन बढाऔं ।
- सिंचाइ क्षेत्रको विस्तार : उत्पादन बृद्धिको आधार ।
- सिंचाइ प्रणालीहरूको निर्माण मर्मत सम्भार एवम व्यवस्थापनमा सक्रिय जनसहभागितामा जुटौं ।
- व्यवसायिक कृषिको प्रमुख आधार बाह्रै महिना सिंचाइ सुविधा पुग्नेगरी सिंचाइ पूर्वाधारहरूको विकास र विस्तार ।

